

تقرير مرفق تحفيز فقراء الريف

الوثيقة: EB 2023/OR/7

التاريخ: 24 أغسطس/آب 2023

التوزيع: عام

اللغة الأصلية: الإنكليزية

للاستعراض

الإجراء: المجلس التنفيذي مدعو إلى استعراض المذكرة بشأن الانتهاء من تنفيذ مرفق تحفيز فقراء الريف

الأسئلة التقنية:

Ashley Anne Davidson

موظفة البرنامج (مرفق تحفيز فقراء الريف)

دائرة إدارة البرامج

البريد الإلكتروني: a.davidson@ifad.org

Donal Brown

نائب الرئيس المساعد

دائرة إدارة البرامج

البريد الإلكتروني: d.brown@ifad.org

للمزيد من المعلومات بشأن مرفق تحفيز فقراء الريف، يرجى زيارة

<https://www.ifad.org/ar/rpsf>

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية - <http://www.ifad.org/ar>

جدول المحتويات

1	موجز تنفيذي
2	أولاً- تحديثات بشأن الانتهاء من تنفيذ مرفق تحفيز فقراء الريف
3	ثانياً- نتائج المرفق الذي جرى الانتهاء من تنفيذه
3	ألف- المستوى الأول- النتائج الإنمائية
6	باء- المستوى الثاني- نطاق الوصول وتقديم الخدمات
8	جيم- المستوى الثالث - كفاءة وفعالية العمليات
10	ثالثاً- الدروس المستفادة
13	رابعاً- الخطوات التالية
	الملحقان
	الملحق الأول: إطار قياس نتائج مرفق تحفيز فقراء الريف
	الملحق الثاني: لمحة عامة عن مشروعات مرفق تحفيز فقراء الريف

موجز تنفيذي

- 1- في 30 سبتمبر/أيلول 2022، انتهى تنفيذ مرفق تحفيز فقراء الريف، وكذلك تنفيذ جميع مشروعاته. وجرى تمديد حالتين محددتين في أفغانستان واليمن على التوالي – لمدة عام واحد بموافقة الجهات المانحة، وذلك يشمل تمويل مرفق تحفيز فقراء الريف لمشروع قائم في اليمن ولآخر في أفغانستان. وسيشارك الصندوق نتائج هذه المشروعات بعد إنجازها.
- 2- وقد نجح المرفق في استهداف موارده وتخصيصها وتنفيذها لدعم السكان الريفيين الفقراء الذين يواجهون آثار جائحة كوفيد-19. وخصص الصندوق 100 في المائة من المبلغ المتاح البالغ 89 مليون دولار أمريكي في 64 مشروعاً في جميع مناطق الخمس، بما يشمل 55 مشروعاً من المشروعات الخاصة ببلد واحد وتسعة مشروعات في بلدان متعددة. ووزعت الأموال على كل ركيزة من الركائز الأربع لمرفق تحفيز فقراء الريف وهي: (أ) توفير المدخلات؛ (ب) الوصول إلى الأسواق؛ (ج) الحصول على التمويل؛ (د) الخدمات الرقمية للمعلومات الزراعية.
- 3- واضطلع الصندوق بالإبلاغ عن المستويات الثلاثة لإطار قياس نتائج مرفق تحفيز فقراء الريف:
- (أ) **ركز المستوى الأول** على مساهمة المرفق في تحسين أو الحفاظ على عدد وجبات الأسر المعيشية وإنتاجها ومبيعاتها ومدخيلها وقدرتها على الصمود وعدد أصولها. ويبين التقييم النهائي القائم على العينات الذي أجراه الصندوق أن ما بين 52 في المائة و77 في المائة من الأسر المعيشية أبلغت عن أدلة على التعافي في كل منطقة، مع تحقيق أقوى النتائج في عدد الوجبات والإنتاج. وتقفز هذه النسبة إلى 90 في المائة لمعظم المؤشرات (باستثناء الأصول) عند إزالة تقييم منفرد واحد يركز حصرياً على الأنشطة الرقمية.
- (ب) **ركز المستوى الثاني** على نطاق الوصول والنواتج. وبالانتهاء من تنفيذ مرفق تحفيز فقراء الريف من المتوقع أن يكون قد دعم مباشرة أكثر من 3.6 مليون شخص من خلال ركائزه الأربع، بمن فيهم 1.1 مليون امرأة و965 000 شاب. ويُترجم ذلك إلى حوالي 19.2 مليون فرد من أفراد الأسر المعيشية. وعلاوة على ذلك، ساعد مرفق تحفيز فقراء الريف ما لا يقل عن 35 مليون شخص إضافي على تلقي معلومات بشأن الكيفية التي يجري من خلالها الوقاية من الجائحة أو التصدي لها أو التعافي منها على نحو أفضل من خلال المنصات الرقمية، مثل البث الإذاعي والبودكاست.
- (ج) **ركز المستوى الثالث** على الأداء التشغيلي. وحقق الصندوق النطاق المستهدف للمرفق وشهد أداء قويا لتنفيذ المشروعات. ولم يحقق الصندوق هدفه الطموح في أن تكون 100 في المائة من المشروعات مراعية للمنظور الجنساني، وإن كان قد حقق ذلك في أكثر من 50 في المائة منها؛ وتجاوز هدفه في أن تكون 50 في المائة من المشروعات مراعية للشباب، إذ حقق ذلك في 62 في المائة منها. ولم يحقق الصندوق أهدافه فيما يتعلق بالاستهلاك وسرعة التنفيذ، ولكنه واصل التحسن بمرور الوقت في جميع المجالات.
- 4- واستفاد الصندوق من دروس هامة، ليس أقلها أن المرفق كان ملائماً ومبتكراً ويتطلب نهجاً تكيفياً. وأظهر مرفق تحفيز فقراء الريف للصندوق كيف وأين يمكنه الاستمرار في زيادة شموليته، وتبسيط إجراءات الاستهلاك، وتركيز الأموال بطريقة أكثر توحيداً، والبقاء مرناً. وتُطبق هذه الدروس على الاستجابات المستقبلية، مثل مبادرة الاستجابة للأزمات الجارية.

تقرير عن مرفق تحفيز فقراء الريف

1- خلال الدورة السابعة والثلاثين بعد المائة للمجلس التنفيذي، أكد الصندوق الانتهاء من تنفيذ مرفق تحفيز فقراء الريف في 30 سبتمبر/أيلول 2022.¹ ويقدم هذا التقرير موجزا لمرفق تحفيز فقراء الريف وتقارير عن الدروس المستفادة والنتائج المجمعة للمرفق بعد الانتهاء من تنفيذه.

أولاً- تحديثات بشأن الانتهاء من تنفيذ مرفق تحفيز فقراء الريف

2- في 30 سبتمبر/أيلول 2022، جرى الانتهاء من تنفيذ مرفق تحفيز فقراء الريف ومن تنفيذ مشروعاته. وجرى تشغيل المرفق بنجاح: فقد وجّه وخصص موارده بشكل فعال لدعم السكان الريفيين الفقراء الذين يواجهون آثار جائحة كوفيد-19. وخصص الصندوق 100 في المائة من المبلغ المتاح البالغ 89 مليون دولار أمريكي في 55 مشروعا من المشروعات الخاصة ببلد واحد وتسعة مشروعات متعددة البلدان في جميع أنحاء مناطقه الخمس. وذهبت أكثر من نصف الموارد عند التصميم إلى البلدان المنخفضة الدخل، و95 في المائة من الموارد إلى البلدان المنخفضة الدخل أو البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا؛ ومن بين هذه الموارد، خُصص نحو نصف جميع الموارد للبلدان ذات الأوضاع الهشة. ووزعت الأموال عند التصميم على كل ركيزة من الركائز الأربع لمرفق تحفيز فقراء الريف وهي: (1) توفير المدخلات، (2) الوصول إلى الأسواق، (3) الحصول على التمويل، (4) الخدمات الرقمية للمعلومات الزراعية. وعلاوة على ذلك، جلبت هذه المشروعات 18.8 مليون دولار إضافية في شكل تمويل مشترك لتكملة تمويل مرفق تحفيز فقراء الريف. وعادة ما يأتي هذا التمويل المشترك في شكل دعم عيني من الجهات المتلقية والمستفيدين، أو أموال من جهات مانحة أخرى أو موارد المنح العادية للصندوق.

3- ونفذت موارد مرفق تحفيز فقراء الريف واستُخدمت في نهاية المطاف، إذ أنجز 62 مشروعا قبل الانتهاء من تنفيذ المرفق. وقد ساعد استخدام أموال مرفق تحفيز فقراء الريف بنجاح في تمكين المشروعات من دعم المزارعين في معالجة آثار الجائحة والصدمات الأخرى.

(أ) في إطار الركيزة الأولى لمرفق تحفيز فقراء الريف، دعم 57 مشروعا المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في مواصلة الإنتاج من خلال عدم تفويت مواسم الزراعة والحفاظ على سبل العيش.² وقُدمت مجموعة من المدخلات إلى المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، تبعا لاحتياجاتهم، وركز معظمها على توفير البذور والأسمدة ولوازم مكافحة الآفات. وقدمت مشروعات أخرى المجترات الصغيرة والماشية (والدعم لرعايتها)، بالإضافة إلى معدات ومجموعات تكنولوجية أخرى موفرة للعمالة.

(ب) لتحسين أنشطة ما بعد الحصاد والوصول إلى الأسواق في إطار الركيزة الثانية، تضمن العديد من المشروعات أنشطة مثل تحسين أو بناء مرافق لتحسين التخزين والمناولة والتجهيز (مثل مراكز التخزين وغرف التبريد)، وتوفير معدات النقل (مثل الدراجات النارية أو الدراجات). وغالبا ما تداخلت ركيزة الدعم هذه مع التركيز على الرقمنة في إطار الركيزة الرابعة، حيث تقوم بعض المشروعات بإنشاء منصات للمعلومات المتعلقة بالأسعار والأسواق أو تطوير أسواقا إلكترونية.

(ج) من خلال دعم الركيزة الثالثة، تهدف المشروعات إلى تحسين الحصول على التمويل الريفي وشروطه. وتشمل الأمثلة عن الأنشطة تقديم الدعم المالي إلى مؤسسات التمويل البالغ الصغر للحفاظ على السيولة لديها، بينما يجري العمل من خلال وسطاء ماليين للوصول إلى المناطق الريفية، وإنشاء صناديق

¹EB 2022/137/R.431

² وسيرتفع هذا العدد إلى 59 مشروعا مع أنشطة الركيزة الأولى بمجرد الانتهاء من المشروعين في أفغانستان واليمن.

دائرة لتقديم مساعدة قروض ميسورة التكلفة لضمان رأس المال العامل والقيام في الوقت نفسه ببناء قدرات منظمات المزارعين والشبكات الريفية الأخرى.

(د) وأخيرا، تضمن 24 مشروعا من مشروعات مرفق تحفيز فقراء الريف أنشطة رقمية. وفي حين أن هذه الأنشطة عادة ما تكمل مجالات الدعم الأخرى، استثمر مشروعا حصريا في المجالات الرقمية. وبشكل عام، سهلت المنصات الرقمية في إطار مرفق تحفيز فقراء الريف التدريب أو الإرشاد الإلكتروني للمجتمعات المحلية الريفية والمؤسسات البالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة وغيرها من أجل تحسين الإنتاج وزيادة القيمة وتعزيز إصدار الشهادات الغذائية وغير ذلك. وكثيرا ما تعمل الأنشطة المتداخلة مع الركيزة الثانية على تعزيز الوصول إلى الأسواق من خلال المنصات الإلكترونية أو توفير معلومات عن الأسواق. وبالإضافة إلى ذلك، قامت المشروعات برقمنة مؤسسات ريفية مثل مصارف المجتمع الريفي ومنظمات المنتجين، وبالتالي دعم قدرة الأسر المعيشية الريفية على الاحتفاظ بالحسابات، وإرسال المعاملات والتحويلات المالية. وأخيرا، استثمر أحد المشروعات في شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الزراعية لتطوير بدائل وابتكارات في الإنتاج والتسويق والتمويل على مستوى شامل.

4- **ومن المهم الإشارة إلى أنه على الرغم من النجاح العام الذي حققه الصندوق، فقد واجه تحديات وتأخيرات أثناء التنفيذ.** أولا، يخدم الصندوق المجتمعات المحلية في السياقات الصعبة، وتستهدف مشروعات مرفق تحفيز فقراء الريف المجتمعات المحلية النائية والتي يصعب الوصول إليها. وبالإضافة إلى ذلك، واجه العديد من البلدان موجات عديدة من جائحة كوفيد-19 ومراحل عديدة من القيود المفروضة على حركة التنقل، وهو ما أثر على مهل التنفيذ. وعلاوة على هذه التحديات، واجهت عدة بلدان صدمات بيئية أو اقتصادية أو صدمات أخرى، مما أدى إلى تفاقم العبء الذي يواجهه السكان الريفيون الضعفاء، وشكل عقبات أمام التنفيذ.

5- **وبالإضافة إلى ذلك، أثرت الحرب في أوكرانيا على سلاسل الإمداد والأسعار عالميا، ونتيجة لذلك، شهد العديد من مشروعات مرفق تحفيز فقراء الريف فترات انتظار أطول للتنفيذ وأسعار أعلى للمدخلات والخدمات مما كان متوخى عند تصميم المشروع.** فعلى سبيل المثال، خلال الأشهر الأخيرة من مشروع في بنغلاديش ومشروع إقليمي في القرن الأفريقي، أدى التأخير في الإمداد إلى توقف شحنات المدخلات والمواد الجارية توريدها في البحر لعدة أشهر. وبشكل أكثر شيوعا، واجهت المشروعات زيادات كبيرة في أسعار المدخلات والخدمات - وهو ما جعل الميزانيات الأصلية غير واقعية. ففي كينيا مثلا، أبلغ المشروع بأن أسعار الأسمدة زادت بنسبة تزيد على 100 في المائة أثناء التنفيذ، وكذلك ارتفعت أسعار البذور، بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا. وجرى تكيف المشروع لتشجيع المزارعين على الحصول على المدخلات محليا.

6- **وفي حالتين نادرتين، لم تكن المشروعات قادرة على تنفيذ أنشطتها المتوقعة تنفيذا كاملا، ولم تنجح في إعادة هيكلة وتنفيذ أي أنشطة مكيفة.** وتضمن ذلك مشروعا إقليميا يركز على تعزيز المؤسسات البالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة يُنفذ من خلال وكالة حكومية دولية في شرق أفريقيا. وكما أشير خلال التقارير المحلية المقدمة إلى المجلس التنفيذي في الصندوق، واجه المشروع تأخيرات في توقيع اتفاقية المنحة وفي عمليات التوريد، على الرغم من الجهود المكثفة التي بذلها موظفو الصندوق فضلا عن دعم التنفيذ المقدم من برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. وفي مدغشقر، واجت الجهة المتلقية من المشروع مشاكل في معالجة طلب التمويل من خلال آليات الحوكمة الداخلية، وهو ما يعني أن جزءا كبيرا من الأموال لم يُصرف في الوقت المحدد ولم يستخدم أبدا. وسيواصل الصندوق استكشاف سبل إدماج هذه الأنشطة في تصميم أو إعادة هيكلة المشروعات الاستثمارية الجارية، إذا كانت ذات صلة باحتياجات البلدان.

7- **وأخيرا، واجه عدد من المشروعات القوة القاهرة والنزاعات.** ففي أعقاب الأزمة السياسية في ميانمار في فبراير/شباط 2021 تحديدا، ألغى المشروع. واتبع الصندوق نهجا تكيفيا لضمان إعادة تخصيص الأموال بسرعة. وكما ذكر أيضا، يواجه الصندوق أوضاعا استثنائية في أفغانستان واليمن، حيث يلزم وقت إضافي

لضمان جودة التنفيذ. وبعد التحديث الأخير، منحت الجهات المانحة لمرفق تحفيز فقراء الريف تمديدات لهذين المشروعين مع الحفاظ على الإنجاز لما تبقى من المرفق. ويجري تنفيذ كلا المشروعين على قدم وساق..

ثانيا- نتائج المرفق الذي جرى الانتهاء من تنفيذه

8- جمع الصندوق نواتج المرفق ونطاق وصوله وحصانه من خلال إطار قياس النتائج المخصص. وعند الانتهاء من تنفيذ الأنشطة والإغلاق المالي، أبلغت كل منحة عن تقدمها ونتائجها مقابل إطار قياس النتائج.

ألف- المستوى الأول- النتائج الإنمائية

تقييمات الأثر السريع لفهم مساهمات مرفق تحفيز فقراء الريف

9- اختار الصندوق عينة من حوالي 20 في المائة من حافظة مرفق تحفيز الفقراء تشمل 13 مشروعاً في مختلف المناطق وأنواع المشروعات لإجراء تقييمات سريعة. وجمع الصندوق بيانات وأجرى تحليلات لتسعة مشروعات خاصة ببلد واحد، و4 مشروعات متعددة البلدان، ركز 11 منها على الركائز من الأولى إلى الرابعة، وركز مشروعان حصراً على الأنشطة الرقمية (الركيزة الرابعة). واعتمدت التقييمات على استبيان تضمن معلومات مبلغ عنها ذاتياً بشأن مؤشرات المستوى الأول، على النحو المبين في الجدول 1. ولا تهدف هذه التقييمات إلى قياس الأثار المنسوبة لتدخل الصندوق، بل إلى تقديم مقياس لتأثيرات المساهمة.

الجدول 1

المستوى الأول لإطار قياس نتائج مرفق تحفيز فقراء الريف


الهدف	المؤشرات	المجموعات المستهدفة (نسبة الإناث: الشباب)
المستوى الأول: النتائج الإنمائية		
التقليل إلى أدنى حد من أثار جائحة كوفيد-19 على سبل العيش والقدرة على الصمود والأمن الغذائي لدى المجموعة المستهدفة للصندوق، والحفاظ على التقدم المحرز في بلوغ المستويات المستهدفة لأثر التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق	(عدد) النسبة المئوية للأسر المعيشية التي أبلغت عن أنه قد جرى الحفاظ على ما يلي أو تحسينه: - قيمة الإنتاج - قيمة المبيعات في السوق - دخل الأسر المعيشية - الأمن التغذوي/الغذائي* - القدرة على الصمود - ملكية الأصول	75 في المائة من الأسر المعيشية التي تتلقى دعماً من خلال الأنشطة التي يمولها مرفق تحفيز فقراء الريف (معرفة على أنها عدد الأشخاص الذين يتلقون دعماً)

* تُقاس من خلال "عدد الوجبات"

10- وبتحليل العينة بأكملها، يبين الشكل 1 متوسط حصة الأسر المعيشية التي أبلغت عن أنه قد جرى الحفاظ على كل مؤشر من مؤشرات المستوى الأول أو تحسينه بعد إدخال مرفق تحفيز فقراء الريف في العينة بأكملها. وقد اشْتُق المتوسط عن طريق ترجيح التقديرات على مستوى المشروعات مع النسبة التي يدعمها كل مشروع من مجموع 20 بلداً اختيرت للتقييم السريع.

الشكل 1

موجز لتأثيرات مساهمة مرفق تحفيز فقراء الريف (متوسط التقديرات المرجحة لنطاق الوصول للعينة الكاملة من المشروعات المختارة من أجل التقييم السريع)، وأيضا من قبل النساء والشباب ينبغي قراءة كل مؤشر بالكامل، "و جرى الحفاظ على النسبة المئوية للإبلاغ [المؤشر] أو زيادتها بعد مرفق تحفيز فقراء الريف "

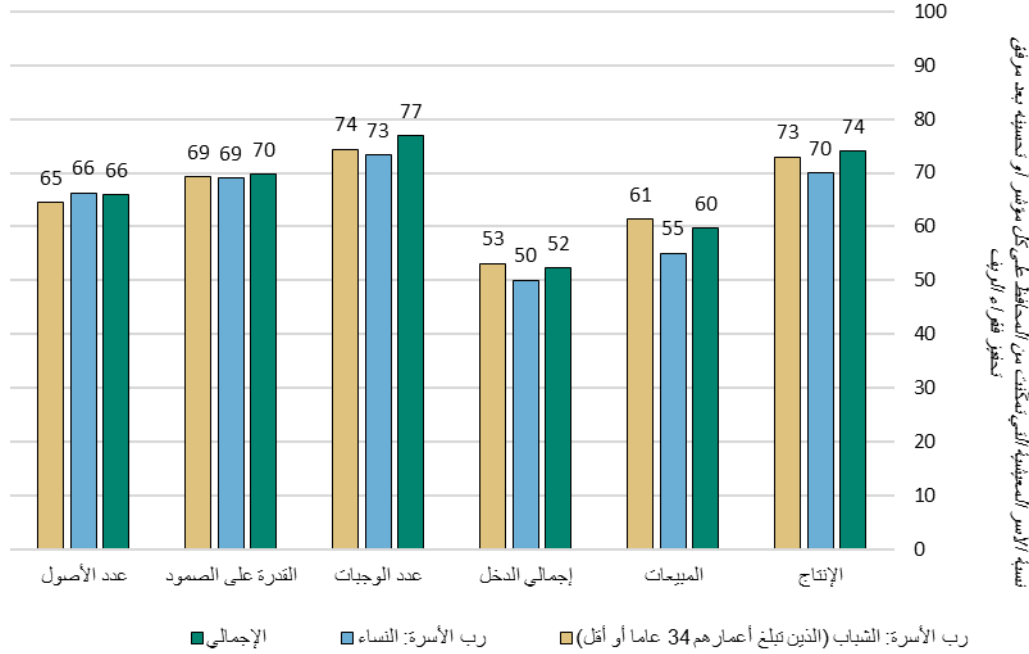


11- تظهر نتائج المستوى الأول أن غالبية الأسر المعيشية المستفيدة شهدت تعافيا قويا من جائحة كوفيد-19 عبر جميع مؤشرات الرفاه بعد بدء أنشطة مرفق تحفيز فقراء الريف. وهذا يشمل عدد الوجبات والإنتاج والمبيعات والدخل والقدرة على الصمود وعدد الأصول. ويبين التقييم النهائي الذي أجراه الصندوق للعينة بأكملها أن مرفق تحفيز فقراء الريف ساعد على الحفاظ على ما بين 52 و 77 في المائة من كل مؤشر أو تحسينه، مع تحقيق أقوى النتائج في عدد الوجبات والإنتاج. وتبين هذه النتائج أن الصندوق قد حقق هدفه المتمثل في أن تبلغ 75 في المائة من الأسر المعيشية بأن الصندوق ساعدها في الحفاظ على عدد وجباتها أو تحسينه وأنه حقق تقريبا هدف الإنتاج؛ لكنه لم يبلغ الهدف المحدد فيما يتعلق بالمؤشرات الأربعة الأخرى.

12- ويعرض الشكل 2 التقديرات باستثناء المشروعين الرقميين فقط، نظرا لطبيعتهما الفريدة ولأن لهما وزنا ثقيلًا في المجاميع النهائية (82 في المائة من نطاق الوصول النهائي المختار للتقدير السريع). وهذا مفيد أيضا للصندوق لفهم تأثيرات الأنشطة التي تدعمها الركائز من الأولى إلى الثالثة، بالنظر إلى أن جميع المشروعات، باستثناء مشروعين، تضمنت هذه الركائز، وأن هذه الأنشطة ترتبط ارتباطا وثيقا بأنشطة مرفق الاستجابة لحالات الطوارئ الجاري للصندوق، وهو مبادرة الاستجابة للأزمات.

الشكل 2

موجز لتأثيرات مساهمة مرفق تحفيز فقراء الريف (متوسط التقديرات المرجحة لنطاق الوصول للمشروعات المختارة من أجل التقييم السريع باستثناء المشروعات الرقمية فقط)، وأيضا من قبل النساء والشباب ينبغي قراءة كل مؤشر بالكامل، "و جرى الحفاظ على النسبة المئوية للإبلاغ [المؤشر] أو زيادتها بعد مرفق تحفيز فقراء الريف "

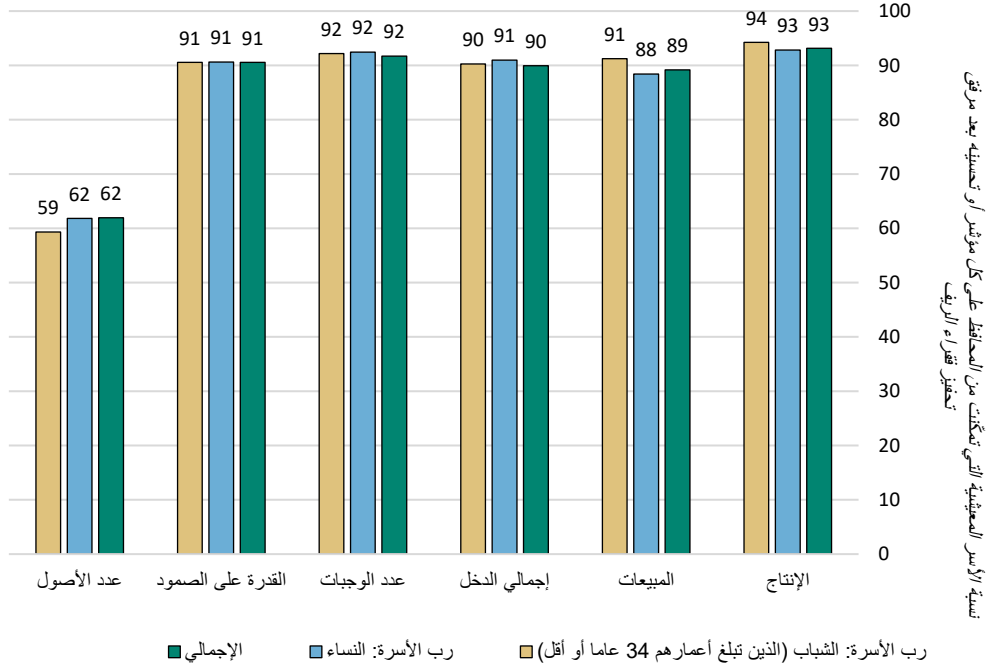

13- وعند إزالة مشروعين منفردين يركزان فقط على الأنشطة الرقمية والإبقاء على المشروعات التي تركز على مجال واحد على الأقل من الركائز من الأولى إلى الثالثة في العينة، يمكن ملاحظة زيادة إلى حوالي 90 في المائة من الإبلاغ عن هذه الفوائد، باستثناء عدد الأصول، الذي ينخفض إلى حوالي 50 في المائة. وهذا يعني أنه بالنسبة للمشروعات البالغ عددها 62 مشروعاً التي لا تركز فقط على الأنشطة الرقمية، من المتوقع أن يكون مرفق تحفيز فقراء الريف قد ساعد 9 من كل 10 أشخاص في الحفاظ على عدد وجباتهم وإنتاجهم ومبيعاتهم ودخلهم وقدرتهم على الصمود أو تحسينها.

14- والتحسينات المبينة في الشكل 2 مدفوعة إلى حد كبير باستبعاد التقييم السريع في كينيا، والذي كان جزءاً من مشروع متعدد البلدان يركز على الخدمات الاستشارية الرقمية، ويمكن اعتباره حالة شاذة ذات نتائج منخفضة على نحو غير عادي ووزن لنطاق وصول مرتفع نسبياً مقارنة بالعينة. ويمكن أن تكون النتائج الأقل إيجابية مرتبطة بالجفاف الشديد ونفسي الجراد الصحراوي الذي حدث خلال موسم الأمطار عام 2021، والذي ربما أعاق اعتماد المشورة. ومع ذلك، قد يشير ذلك إلى أن بعض المجتمعات المحلية كافحت أكثر للتعافي من آثار الجائحة. وقد يشير أيضاً إلى أنه في حين أن المشروعات الرقمية لديها إمكانات نطاق وصول أعلى، فإن هذه التدخلات قد تحقق فوائد مختلفة أو أقل فورية مقارنة بأنواع أخرى من التدخلات في سياقات معينة.

15- وتقدر هذه التقييمات أن ما يقرب من 3 ملايين أسرة معيشية قد استفادت من حيث عدد الوجبات والإنتاج والقدرة على الصمود، وأكثر من مليوني أسرة معيشية من حيث المبيعات والدخل والأصول. ويقدم الجدول

2 تقديرات للعدد الإجمالي للأسر المعيشية والأشخاص الذين استفادوا في الحافظة بأكملها المكونة من 64 مشروعا استنادا إلى استقراء النتائج.³

الجدول 2

استقراء تأثيرات مساهمة مرفق تحفيز فقراء الريف في الحافظة بأكملها، بحسب الأسر المعيشية والأشخاص

التقدير	الإنتاج	المبيعات	إجمالي الدخل	عدد الوجبات	القدرة على الصمود	عدد الأصول
بملايين الأسر المعيشية التي أبلغت عن الحفاظ على المؤشر أو زيادته بعد مرفق تحفيز فقراء الريف	2.8	2.4	2.2	2.9	2.7	2.3
بملايين الأشخاص الذين أبلغوا عن الحفاظ على المؤشر أو زيادته بعد مرفق تحفيز فقراء الريف	15.2	12.9	11.9	15.5	14.4	12.4

باء- المستوى الثاني- نطاق الوصول وتقديم الخدمات

16- ركزت مؤشرات المستوى الثاني على رصد نطاق وصول ونواتج مرفق تحفيز فقراء الريف عموما. وتشمل البيانات أيضا تصنيفا حسب النساء والشباب.⁴

الجدول 3

المستوى الثاني لإطار قياس نتائج مرفق تحفيز فقراء الريف

الهدف	المؤشرات	الفئات المستهدفة (نسبة الإناث: الشباب)	النتائج
المستوى الثاني: نطاق الوصول وتقديم الخدمات			
نطاق الوصول العام	عدد الأشخاص الذين يتلقون دعما من خلال الأنشطة التي يمولها المرفق بموجب الركائز من 1 إلى 3 عدد الأشخاص الذين يتلقون دعما من خلال الأنشطة التي يمولها المرفق بموجب الركيزة 4	1.1 مليون - 6.9 مليون * (25:50:50) 0.5 مليون - 60 مليونونا * (25:50:50)	الركائز من 1 إلى 3: 1 164 049 (563 160 من الإناث؛ 379 544 من الشباب) الركيزة 4: 2 573 482 (647 789 من الإناث؛ 629 636 من الشباب) التي تدعم على وجه التحديد الإنتاج أو إدرار الدخل أو بناء القدرات الزراعية أو المعلومات والخدمات المالية إضافة إلى 35 000 000 شخص وصلوا عبر البث الإذاعي والبودكاست إلى المعلومات المتعلقة بالوقاية والتعافي من جائحة كوفيد-19
الركيزة 1: توفير المدخلات والأصول الأساسية للإنتاج	عدد المنتجين الريفيين الذين يحصلون على مدخلات الإنتاج و/أو الحزم التكنولوجية (في ظل الظروف التي تتسم بالإجهاد/الاضطرابات)	متنوع (25:50:50)	881 503 (395 477 من الإناث؛ 255 902 من الشباب)
الركيزة 2: تيسير الوصول إلى الأسواق	عدد المنتجين الريفيين (ومنظمات المنتجين حيثما انطبق ذلك) الذين يتلقون دعما لجمع، و/أو تخزين، و/أو نقل، و/أو بيع منتجاتهم (في ظل الظروف التي تتسم بالقيود/تدابير وبروتوكولات السلامة)	متنوع (25:50:50)	236 615 (135 870 من الإناث؛ 105 517 من الشباب) وما لا يقل عن 450 منظمة من منظمات المنتجين
الركيزة 3: توجيه الأموال للحفاظ على الخدمات والأسواق وفرص العمل	قيمة الأموال المقدمة بالدولار الأمريكي لمقدمي الخدمات المالية الريفية (في ظل الظروف التي تتسم بتعطل الأعمال أو مشاكل في السيولة)	متنوع (25:50:50)	5 813 233 دولارا أمريكيا (وأكثر إلى وكالات أخرى مثل التعاونيات وما إلى ذلك) 72 647 (48 004 من الإناث؛ 20 356 من الشباب)

³ لمزيد من التفاصيل بشأن المنهجيات والتحليلات لنتائج المستوى الأول، اتصل بشعبة البحوث وتقييم الأثر.

⁴ يمكن حساب الأشخاص مرتين عبر ركائز الدعم، إذ أن المستفيدين كثيرا ما يتلقون أكثر من نوع واحد من الدعم، ولكن لا يجري حسابهم مرتين في أرقام النطاق الإجمالي الواردة في الفقرة 18. ومن المحتمل أن يكون الرقم الخاص بتوفير المدخلات أقل من الواقع، ولكنه متحفظ بسبب مشكلات جودة البيانات في بعض المشروعات.

السكان الريفيين الفقراء	العدد المقدر للمنتجين الريفيين المستفيدين من قروض جديدة أو شروط محسنة للقروض القائمة من خلال مقدمي الخدمات المالية الريفية المدعومين. **
الركيزة 4: تقديم المعلومات المتعلقة بالزراعة من خلال الخدمات الرقمية.	عدد الأشخاص الذين حصلوا على تدريب عن بعد في ممارسات/تكنولوجيات الإنتاج أو في أنشطة أخرى مدرة للدخل عدد الأشخاص المتصلين بالمنصات الإلكترونية للحصول على المعلومات، وإرسال الأموال واستلامها والخدمات الرقمية الأخرى حيثما انطبق ذلك
1 414 302 (302 449 من الإناث؛ 284 009 من الشباب)	مُنْتَج (25:50:50)
2 508 847 (609 081 من الإناث؛ 617 182 من الشباب)	مُنْتَج (50:50:25)

* النطاق الذي يحدده المرفق الذي يُعَيى ما بين 40 مليون دولار أمريكي و250 مليون دولار أمريكي من التمويل، وحسب طلب البلد.
** قد تشمل الشروط المحسنة تأجيل سداد القروض و/أو تخفيض الفائدة على القروض.

نطاق الوصول العام لمرفق تحفيز فقراء الريف

17- من المتوقع أن يكون مرفق تحفيز فقراء الريف قد دعم بشكل مباشر أكثر من 3.6 مليون شخص مع الانتهاء من تنفيذه، بمن فيهم 1.1 مليون امرأة و965 ألف شاب. ويُترجم ذلك إلى حوالي 19.2 مليون فرد من أفراد الأسر المعيشية. وهذا يجعل الصندوق يتماشى مع تقديراته لأثر المرفق، أي الوصول إلى 20 مليون شخص من خلال ركائز الدعم الأربع لديه، وهي ليست مهمة سهلة بالنظر إلى التحديات المذكورة أعلاه. وبالإضافة إلى ذلك، فهذا تقدير متحفظ، لا يراعي الأثر المستمر من خلال المشروعات القائمة أو توسيع النطاق من خلال التمويل المشترك، ولا النتائج التي تحققت المشروعات الجارية في أفغانستان واليمن.

18- ودعم مرفق تحفيز فقراء الريف أيضا 35 مليون شخص إضافي من خلال منصات رقمية أخرى للوقاية من الجائحة أو التصدي لها أو التعافي منها بشكل أفضل. وغالبا ما تتجاوز المشروعات مجرد الركائز الأربع للأنشطة عندما تتسنى الاستفادة من الأنشطة والشراكات القائمة لتحقيق فوائد أخرى. ففي إثيوبيا مثلا، بالتعاون مع Farm Radio International Ethiopia، تيبث الإذاعة رسائل مشتركة للتوعية بشأن التقليل إلى أدنى حد من مخاطر جائحة كوفيد-19 إلى ما يقدر بنحو 4.5 مليون مستمع. وبالمثل، في مشروع دعم المزارعين الأفارقة في المشروع الإقليمي لحالة الطوارئ لعام 2020، دعمت منظمة مزارعين إقليمية - شبكة منظمات المزارعين والمنتجين الزراعيين في غرب إفريقيا - 127 بودكاست لمناقشة المسائل المتعلقة بجائحة كوفيد-19 في القطاع الزراعي- الحرجي-الرعي، ووصلت إلى ما يقدر بنحو 30 مليون شخص. وقد استُبعدت هذه العوامل من حسابات نطاق الوصول، التي ركزت على الدعم بحسب الركائز، ولكنها تعتبر إنجازات ملحوظة لمرفق تحفيز فقراء الريف.

نطاق الوصول المفصل والحصائل المحددة بحسب الركيزة

19- فيما يتعلق بتقسيم الركائز، دُع أكثر من 1.2 مليون شخص مباشرة من خلال الركائز من الأولى إلى الثالثة من خلال توفير الأصول الإنتاجية أو تيسير الوصول إلى الأسواق أو التمويل. وكان توفير المدخلات، كما ذكر، محور تركيز مرفق تحفيز فقراء الريف. وقامت مشروعات عديدة بتكثيف جهودها في هذا المجال حتى بعد تصميمها، فعملت على تكييف المشروعات وإعطاء أولوية أكبر لهذه الأنشطة استجابة للتحوّل في الصدمات والأسعار والأسواق العالمية؛ خصوصا بالنسبة للأسمدة والبذور. ففي ملاوي مثلا، زاد المشروع من تركيزه على إنتاج وتوفير الأسمدة الحيوية، وسيتطلع إلى توسيع نطاق هذا المجال في مشروعات أخرى في البلد.

20- وبالإضافة إلى ذلك، ركز العديد من المشروعات بدلا من ذلك أو أيضا على الركيزتين الثانية والثالثة، وغالبا ما استكملت الركيزة الأولى. ففي جزر القمر مثلا، قدم المشروع مدخلات محسنة للأسر المعيشية الضعيفة. وبالإضافة إلى ذلك، وفر المشروع بنية تحتية لتخزين المنتجات الزراعية، ودراجات بخارية ثلاثية العجلات لضمان نقل المنتجات الطازجة - وبالتالي تعزيز الروابط مع الأسواق من المدخلات المقدمة وتعميق الأثر. وغالبا ما ركزت المشروعات (بما في ذلك في جزر القمر) على التدريب على الإنتاج والمبيعات وتطوير الأعمال وغيرها من المجالات لزيادة الاستفادة.

- 21- وبالنسبة لأنشطة الركائز من الأولى إلى الثالثة هذه، حقق الصندوق تقريبا هدفه المتمثل في تقديم الدعم إلى 50 في المائة من النساء بشكل مباشر، إذ وصل إلى 48 في المائة؛ وتجاوز هدفه المحدد بـ 25 في المائة على الأقل من الشباب، إذ وصل إلى 33 في المائة. ويعد ذلك إنجازا ونجاحا هامين لمرفق تحفيز فقراء الريف، إذ احتاجت مشروعات الصندوق إلى تنفيذ استراتيجيات الاستهداف بسرعة كبيرة والبدء في التنفيذ. وعزت عدة مشروعات النجاح هنا إلى الاستفادة من خبرات مشروعات الصندوق القائمة والشركاء المحليين.
- 22- وبالنسبة للركيزة الرابعة، زُود 2.6 مليون شخص تقريبا بالمعلومات المتعلقة بالزراعة من خلال الخدمات الرقمية. وبالنسبة لهذه الركيزة، رُبط 2.5 مليون شخص حديثا بمنصة جديدة أو قائمة، وزُود 1.4 مليون شخص بنوع من التدريب عن بعد على ممارسات/تكنولوجيات الإنتاج أو في أنشطة أخرى مدرة للدخل، وغالبا ما يجري ذلك من خلال خدمات الإرشاد عن بعد.
- 23- وهنا، كان الصندوق أقل نجاحا في طموحه المتمثل في ضمان أن تمثل النساء 50 في المائة على الأقل من الأطراف التي تتلقى الدعم (إذ بلغت نسبتهن 25 في المائة فقط)؛ زعم ذلك فقد حققت النسبة المستهدفة المحددة للشباب والبالغة 25 في المائة. وفقا للأدلة السرديّة من المشروعات، فإنه من الصعب على نحو خاص الوصول إلى النساء من خلال خدمات رقمية معينة في سياقات معينة. فعلى سبيل المثال، تأتي أكبر نسبة لنطاق الوصول من مشروع Precision Development في باكستان وهو مشروع مُنفذ يقدم خدمات استشارية رقمية. وفي باكستان، حيث جرى الوصول إلى أكثر من 1.3 مليون شخص، عادة ما كانت تُرسل الرسائل عن طريق الرسائل القصيرة والمكالمات الفورية إلى الرجال الذين يشرفون على هواتف الأسرة المعيشية. لكن هذا لا ينفى استفادة النساء (والشباب). وفي هذه الحالة، أرسلت الرسائل إلى هواتف الأسرة المعيشية، وشجع المشروع الأسر على الاستماع إليها معا - وبالتالي دعم التمكين بطريقة واقعية وحساسة ثقافيا. وبهذه الطريقة، من المرجح أن يُقلل من شأن الآثار المترتبة على النساء والشباب.

الخاتمة والنواتج القطرية

- 24- بشكل عام، تمكن مرفق تحفيز فقراء الريف من تقديم دعم بعيد المدى وشامل عبر ركائزه الأربع بما يتماشى مع أهدافه عند التصميم. ومع ذلك، فإنه لم يحقق كل هدف طموح.

جيم- المستوى الثالث - كفاءة وفعالية العمليات

- 25- إن المستوى الثالث من إطار قياس نتائج مرفق تحفيز فقراء الريف يقيس أداء عمليات الصندوق. وترد في الجدول 4 أدناه تفصيل لمؤشرات إطار قياس النتائج هذه.

الجدول 4

المستوى الثالث لإطار قياس نتائج مرفق تحفيز فقراء الريف

النتائج	الفئات المستهدفة (نسبة الإناث: الشباب)	المؤشرات	الهدف
المستوى 3: كفاءة وفعالية العمليات			
89 مليون دولار أمريكي (100 في المائة من مجموع الأموال المتوفرة)	40 مليون دولار أمريكي – 250 مليون دولار أمريكي	قيمة الأموال الموافق عليها	النطاق
53 في المائة في المائة 62 في المائة	100 في المائة في المائة 50 في المائة	النسبة المئوية للمشروعات الموافق عليها والتي تراعي الاعتبارات الجنسانية نسبة المشروعات الموافق عليها والتي تراعي الشباب	الإدماج الاجتماعي
64 يوما 217 يوما	30 يوما 30 يوما	متوسط الفترة الزمنية بين تقديم المشروع إلى لجنة استراتيجية العمليات وتوجيه السياسات وموافقة رئيس الصندوق متوسط الفترة الزمنية بين موافقة المجلس التنفيذي/رئيس الصندوق إلى أول صرف (أيام)	سرعة استجابة الصندوق
يُحدد لاحقا 50	100 في المائة	معدل صرف الأموال في تاريخ الإنجاز المقرر عدد المشروعات المنفذة من خلال الجهات الحكومية عدد المشروعات المنفذة من خلال التعاون بين الأمم المتحدة/الوكالتين اللتين تتخذان من روما مقرا لهما عدد المشروعات المنفذة بالشراكة مع منظمات المزارعين أو المنظمات غير الحكومية أو القطاع الخاص	سرعة التنفيذ
14 16	مُنْتَبِع مُنْتَبِع		الشراكات على المستوى القطري
92 في المائة	صُنِّفت نسبة 90 في المائة على أنها مرضية إلى حد ما أو أفضل من ذلك	التصنيف العام للتقدم المحرز في التنفيذ بناء على آخر بعثة إشراف أو تقرير إنجاز	الأداء العام

نطاق الوصول والأداء العام

26- في إطار نتائج المستوى الثالث للصندوق بشأن أداء العمليات، حقق الصندوق النطاق المستهدف للمرفق وشهد أداء تنفيذيا قويا للمشروعات. وكما ذكر سابقا، وافق الصندوق بنجاح على 64 مشروعا من مشروعات مرفق تحفيز فقراء الريف وخصص لها 89 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 92 في المائة من المشروعات التي أنجزت بتقدير مرض إلى حد ما أو أعلى من ذلك من حيث أداء التنفيذ. وكان الرصد والمرونة والإدارة التكيفية عوامل أساسية هنا.

الإدماج الاجتماعي

27- لضمان استجابة شاملة لصددمات الجائحة، وضع الصندوق أهدافا طموحة للإدماج الاجتماعي. في إطار التصميم، طبقت مشروعات مرفق تحفيز فقراء الريف معايير مكيمة للدفع نحو الإدماج الاجتماعي الإيجابي في مشروعاته، وتحديدًا نحو المنظور الجنساني والشباب. ولكي تراعي المشروعات المنظور الجنساني، يجب أن تكون نسبة 50 في المائة من المستفيدين المباشرين من النساء، ويجب أن تتضمن المشروعات عناصر لتعزيز القدرة الاقتصادية للمرأة على الصمود وصوتها. ولكي يكون المشروع مراعيًا للشباب، يجب أن يكون 25 في المائة من المستفيدين المباشرين من الشباب، مع دعم قدرتهم الاقتصادية على الصمود من قبل المشروع.

28- ومقابل الأهداف الطموحة جدا المتمثلة في أن تكون 100 في المائة من المشروعات مراعية للمنظور الجنساني، لم يحقق الصندوق هذه النسبة المستهدفة، إذ بلغت نسبة المشروعات التي تراعي المنظور الجنساني 53 في المائة. وكان العائق الرئيسي هنا هو بلوغ عتبة نطاق الوصول الجنساني البالغة 50 في المائة لكل مشروع، بما في ذلك من خلال الأنشطة الرقمية، كما ذكر سابقا. وفي حالات أخرى، لم ينفذ المشروع المعايير الأخرى - ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الطبيعة البسيطة والسريعة للمشروعات. ففي ليبيريا

مثلا، ركز المشروع ببساطة على توفير المدخلات من دون التمكين والتدريب، وكافح لإشراك النساء أثناء التصميم نظرا للجدول الزمنية السريعة. ولذلك، لم يتسن للمشروع تحقيق المكون الهام المتمثل في مراعاة المنظور الجنساني، على الرغم من أن غالبية أولئك الذين يتلقون الدعم هم من النساء.

29- وتجاوز الصندوق هدفه المتمثل في أن تكون 50 في المائة من المشروعات مراعية للشباب، إذ حقق 62 في المائة. وعلاوة على ذلك، كان الدعم في كثير من الأحيان شاملا للغاية. ففي مالي مثلا، استهدف مشروع مرفق تحفيز فقراء الريف الشباب فقط، ولا سيما المدخلات، إذ قدم الدعم أيضا في ربطهم بالأسواق، بما في ذلك من خلال ربطهم بشبكات التسويق وتقنيات التجارة الإلكترونية، وتعزيز قدراتهم القيادية مع التعاونيات.

الأداء السريع

30- لدفع الاستجابة السريعة، وضع الصندوق أهدافا طموحة للغاية لتسريع الاستهلال والتنفيذ. ومع ذلك، وبسبب السياقات الصعبة المذكورة أعلاه، لم يتمكن الصندوق من تحقيق الأهداف المذكورة. ومع ذلك، فقد أصبح أسرع بمرور الوقت. وكان هذا هو الحال بالنسبة لكلا المؤشرين. بداية، كان هدف الصندوق هو قضاء 30 يوما في المتوسط بين تقديم المشروع إلى لجنة استراتيجية العمليات وتوجيه السياسات وموافقة رئيس الصندوق. ومع ذلك، كان الرقم الفعلي تقريبا 64 يوما. وخلال عام 2022، تحسن الوقت اللازم للموافقة بشكل كبير بمتوسط 23 يوما (أسرع من الوقت المستهدف)، إذ لم يعد الصندوق بحاجة إلى وضع واستعراض مقترحات عديدة في وقت واحد وتمكن من مواصلة تبسيط مجموعة إجراءاته الراسخة جيدا. وكان للصندوق نفس الفترة المستهدفة وهي 30 يوما لمتوسط الوقت اللازم للانتقال من الموافقة إلى الصرف الأول. ولم يكن هذا الإطار الزمني واقعيًا، وعلى الرغم من الجهود المكثفة، استغرق تقريبا 217 يوما في المتوسط. ومع ذلك، تحسنت السرعة عموما بمرور الوقت، إذ بلغ متوسطها تقريبا 99 يوما للأدوات الموافق عليها في عام 2022. ومن الناحية العملية، كانت سيطرة الصندوق على هذا المؤشر أقل من سيطرته على الموافقات، لأنه يتطلب إجراء مفاوضات أيضا مع النظراء. والحقيقة أن ما يقرب من نصف الوقت الذي يُستغرق في الوصول إلى الصرف قد قُضي في وضع الاتفاقيات في صيغتها النهائية.

الشراكات على المستوى القطري

31- اكتسبت الشراكات على المستوى القطري أهمية بالغة بالنسبة للمرفق. ونفذ الصندوق من خلال 50 حكومة و16 منظمة غير حكومية، فضلا عن منظمات المزارعين وكيانات أخرى تابعة لأطراف ثالثة. وبالإضافة إلى ذلك، تعاون الصندوق مع الوكالتين الأخريين اللتين تتخذان من روما مقرا لهما ووكالات الأمم المتحدة الأخرى من أجل تصميم وتنفيذ 14 مشروعا، مستفيدا من المزايا النسبية والتكامل. واختلف نوع الدعم حسب المشروع. ففي إسواتيني مثلا، كانت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة هي الوكالة المنفذة الرائدة لمشروع واحد من مشروعات مرفق تحفيز فقراء الريف. وفي السودان، عمل برنامج الأغذية العالمي والصندوق معا لتوجيه دعم مرفق تحفيز فقراء الريف إلى الأشخاص الذين استقروا مؤخرا من خلال تدخل برنامج الأغذية العالمي.

ثالثا- الدروس المستفادة

32- كان لمرفق تحفيز فقراء الريف أثر كبير على الأسر المعيشية الريفية التي تواجه التأثيرات السلبية لجائحة كوفيد-19، ليس ذلك فحسب، بل كان أيضا عملية تعلم مهمة للصندوق. وقد برزت دروس تقنية وتنفيذية عديدة يمكن النظر فيها أثناء تنفيذ الاستجابات الأخرى لحالات الطوارئ وللحفاظة العامة للصندوق.

الدروس المستفادة من مرفق تحفيز فقراء الريف

- 33- **الدرس الأول هو أن الصندوق قادر على تحسين رفاه الأسر المعيشية الريفية استجابة للصددمات من خلال آليات المنح السريعة.** وقد تجلّى ذلك في النواتج والحاصلات الإيجابية في إطار المستويين الأول والثاني لمرفق تحفيز فقراء الريف. وبشكل عام، وضع مرفق تحفيز فقراء الريف خطة طموحة وكان بمثابة آلية فريدة من نوعها في الاستجابة للصددمات غير المسبوق. وعلى الرغم من أوجه عدم اليقين، تمكن الصندوق من تقديم الدعم المباشر لـ 3.6 مليون شخص في إطار ركائزه الأربع، وعشرات الملايين بمازيا أخرى.
- 34- **وأظهر مرفق تحفيز فقراء الريف أيضا الدرس المتمثل في أن الركائز الأربع المختارة هي عموما طريقة مجدية للتنفيذ الكامل والسريع.** وعلى الرغم من أن استهلاك المرفق استغرق وقتا أطول مما كان متوقعا، فإن الأنشطة نفذت عموما في الوقت المناسب بمجرد بدئها. وباستثناء أنواع البنية التحتية الأكثر تطورا التي لم تتحقق (مثل الصوامع في رواندا)، كان توفير المدخلات والتمويل والخدمات الرقمية والبنية التحتية البسيطة (مثل توفير الإمدادات للبيوت البلاستيكية في لبنان) سريعا في معظم الحالات. ولا يزال هناك العديد من المشروعات لم تُنفذ حسب الجداول الزمنية للإنجاز المحددة عند التصميم، حتى أن بعضها يتجاوز أهداف نطاق الوصول عند الانتهاء من تنفيذها.
- 35- **وبالإضافة إلى ذلك، وجد الصندوق أن هذه الآلية للاستجابة للأزمات قابلة للتنفيذ في البلدان ذات الأوضاع الهشة.** وتوزعت أموال الصندوق على 36 مشروعا في البلدان التي تواجه الهشاشة. وشكل تنفيذ جميع هذه المشروعات تحديات، وتطلب الرصد والتكيف والصبر. ففي جنوب السودان مثلا، شمل المشروع مناطق يحتمل أن تشهد عنفا واضطر إلى تكييف المواقع الجغرافية. وجرى عزو النجاح هنا إلى وجود أنشطة بسيطة تراعي السياق، والاستفادة من شبكات الشراكات والمعارف على أرض الواقع، والمرونة للتكيف مع السياق.
- 36- **وعلاوة على ذلك، تقدم المشروعات أدلة سرديّة على أن أنشطة مرفق تحفيز فقراء الريف لا تزال مرتبطة بزيادة قدرة الأسر المعيشية على الصمود في وجه آثار صدمات الأخرى المناخية منها وتلك المرتبطة بالإمدادات بسبب آثارها المباشرة على سبل العيش.** ويرى الصندوق أن صدمات أخرى، مثل الحرب في أوكرانيا والصددمات المناخية، تشكل تهديدات مماثلة للمجتمعات المحلية الريفية، وأن مرفق تحفيز فقراء الريف قد عزز القدرة على الصمود في وجه هذه الصدمات. فعلى سبيل المثال، في مشروعات في الكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية، جاء إدخال الأسمدة العضوية في الوقت المناسب في مواجهة آثار الحرب في أوكرانيا على الأسعار والحصول على المدخلات. وعلاوة على ذلك، في باكستان، استعان أحد المشروعات التي نفذتها منظمة Precision Development في باكستان يركز على الخدمات الاستشارية الرقمية بالتكنولوجيا الحالية لتحذير المزارعين من الفيضانات الكارثية، وهو ما مكن البعض من حصاد القطن في وقت مبكر وحماية الماشية.
- 37- **وبالإضافة إلى ذلك، وجد الصندوق أن الابتكارات الرقمية هي مكون ناجح للتعافي من جائحة كوفيد-19، مع نطاق وصول واسع وتكلفة منخفضة نسبيا لكل مستفيد.** وتعلم الصندوق أيضا أنه يمكن القيام بالمزيد عند التصميم والتنفيذ عند استهداف المجموعات المهمشة التي تواجه حواجز في الاستخدام أو الوصول. وكما ذكرنا، كان استخدام الخدمات الرقمية أمرا بالغ الأهمية خلال الجائحة في التغلب على القيود المفروضة على حركة التنقل وفي الوصول إلى 2.6 مليون شخص، بمن في ذلك الأشخاص الذين يعيشون في المناطق النائية أو غير الآمنة. وعلى الرغم من هذه الفوائد الإيجابية جدا، لم يتمكن الصندوق من تحقيق 50 في المائة من نطاق الوصول إلى النساء. وكما ذكر، قد يرجع ذلك جزئيا إلى العقبات السياقية والاجتماعية التي تحول دون وصول النساء إلى الأدوات الرقمية أو استخدامها. وفي النهاية، كان التركيز على الرقمنة ابتكارا طموحا وبالغ الأهمية لدفع خطة تحويلية في الزراعة. وسينظر الصندوق في دراسات الحالة هذه وسيدمج الدروس المستفادة في المشروعات الجارية وتصاميم الصندوق في المستقبل.

38- وفيما يتعلق بمشروعات مرفق تحفيز فقراء الريف، أدرك الصندوق أيضا أن استخدام هياكل التنفيذ القائمة للمشروعات يزيد من الاستدامة وقابلية التوسع والكفاءة على وجه الخصوص. وكثيرا ما استخدم هذا النهج للاستفادة من المشروعات الاستثمارية الجارية للصندوق والاستفادة من وحدات إدارة المشروعات/البرامج التابعة له لتيسير الاستهلاك. وكانت لذلك أيضا فائدة تتمثل في المساهمة المباشرة في الحفاظ على المكاسب الإنمائية لمشروعات الصندوق. وفي حالات أخرى، وظّفت أموال مرفق تحفيز فقراء الريف من خلال أطراف ثالثة، مثل المنظمات غير الحكومية ومنظمات المزارعين، المتجذرة بعمق في المجتمعات الريفية المستهدفة. وفي كلتا الحالتين، أظهرت المشروعات كيف أن العمل مع الوكالات المنفذة القائمة ذات الهيكلية القائمة يساعد على التعجيل بالاستجابة، بما في ذلك من خلال ضمان توافر الموظفين ووضع التقييمات واستراتيجيات الاستهداف على وجه السرعة.

39- وعلى الرغم من النتائج الإيجابية لمرفق تحفيز فقراء الريف، فمن شأن ضمان تحديد الأولويات، وتوفير الموارد الكافية الجاهزة للصرف، وتوحيد المشروعات أن يساعد على زيادة كفاءة وفعالية المبادرات الطارئة في المستقبل. وبالرغم من أن الصندوق نجح في تقديم الإغاثة إلى أكثر من 60 بلدا من خلال مرفق تحفيز فقراء الريف، فإن الحجم الكبير للمنح الأصغر نسبيا التي جرت الموافقة عليها في إطار المرفق (بين 200 000 و3 ملايين دولار أمريكي) أثبت أنه عقبة أمام تحقيق الصندوق لأهدافه الطموحة لسرعة التصميم والتنفيذ. وقد أدى وجود العديد من المشروعات الصغيرة إلى مجموعة متزامنة من التصاميم والموافقات والتنفيذ والتفاوض على الاتفاقيات والإغلاق المالي. وقد تفاقم هذا الوضع بسبب الوقت اللازم لصرف المساهمات، وهو ما أسفر عن جولتين رئيسيتين من التمويل، وبالتالي مضاعفة عدد إجراءات الموافقة على المشروعات. والدرس المستفاد هو أن الاستجابة في الوقت المناسب تتطلب موارد تتوافر مسبقا قدر الإمكان، وأن هناك مقايضة بين توزيع الموارد على نطاق واسع، ولكن بشكل أقل وسرعة الاستجابة الشاملة. وفي المستقبل، ينبغي أن ينظر الصندوق في التركيز على توحيد الاستجابات في المشروعات الأوسع نطاقا، التي تنطوي أيضا على مكاسب محتملة بالنسبة للنطاق والاستدامة.

40- وبالإضافة إلى ذلك، وبينما أن مشروعات مرفق تحفيز فقراء الريف تبسط التصميم والتنفيذ حيثما أمكن ذلك، وجدت معظم الجهات المتلقية والأفرقة التابعة للصندوق أن هناك مجالا لعمليات أكثر كفاءة كاستجابة للأزمات. فعند التصميم، وجدت الأفرقة أنه يمكن أن تكون هناك عمليات موافقة أكثر مرونة، ويرجع ذلك جزئيا إلى تجميع العديد من المشروعات. وكما ذكر سابقا، تقلص وقت الموافقة بأكثر من النصف خلال عام 2022 بمجرد أن حسن الصندوق آلياته الداخلية لتيسير عمليات استعراض الجودة. وبالإضافة إلى ذلك، كان تنفيذ الاتفاقيات بين الموافقة والصرف عملية تستغرق وقتا طويلا. وبالرغم من أن كيانات الطرف الثالث كانت أكثر سرعة بشكل عام، غالبا ما يكون لدى الحكومات عمليات موافقة داخلية طويلة خاصة بها. وأشارت أفرقة الصندوق أيضا إلى أن إجراءات التوريد قد تكون طويلة. ووجد البعض طرقا عملية للتكيف، كما هو الحال في رواندا، حيث اعتمد المشروع على مقدمي المدخلات الذين لديهم عقود إطارية قائمة وصالحة لتقليل الوقت. ومع ذلك، ينبغي للصندوق والجهات المتلقية والشركاء اتباع نهج استباقي لضمان تبسيط الإجراءات من التصميم إلى الإغلاق لأي استجابة طارئة في المستقبل.

41- وقد أثبت مرفق تحفيز فقراء الريف أن المرونة في إجراءات التنفيذ ضرورية في سياقات الأزمات وأنه ينبغي للصندوق أن ينقل ما جرى تطويره إلى استجابات طارئة في المستقبل. وفي ظل جائحة كوفيد-19، كان على المشروعات إيجاد طرق للعمل بين موجات جديدة من الفيروس والقيود المتكررة على حركة التنقل. وقد تفاقم هذا الوضع بسبب صدمات أخرى، ومن الأمثلة على ذلك الجفاف في القرن الأفريقي، والثوران البركاني في المحيط الهادي، والآثار على الكثيرين بسبب الحرب في أوكرانيا. لذلك أصبح من الأهمية بمكان الاستعداد لإضافة التمويل وإعادة توجيه الموارد وإعادة الهيكلة في الوقت المناسب للاستعداد مسبقا للاحتياجات المتغيرة للمشروعات والبلدان. وبالرغم من أن ذلك جرى على مدار فترة عمل مرفق تحفيز فقراء

الريف، كان لا بد في كثير من الأحيان من وضع سياسات استجابة للسيناريوهات المتطورة. وأسهم هذا النوع من المرونة إسهاما إيجابيا في تخصيص 100 في المائة من الموارد المتاحة. وبالنسبة للاستجابات المستقبلية، ينبغي أن يستفيد الصندوق مما طوره بالفعل في إطار مرفق تحفيز فقراء الريف لزيادة نشاطه الاستباقي من أجله ومن أجل الجهات المتلقية في هذه المجالات، ومعرفة المجالات التي يمكن أن يبسطها أكثر فأكثر.

42- وعلى نفس المنوال، فإن السماح ببعض المرونة في الجداول الزمنية يمكن أن يساعد أيضا في التعامل مع الصدمات الشاملة، وقد يسمح بأنشطة إضافية تزيد من الاستدامة. وبالإضافة إلى الأدوات اللازمة للتكيف مع المشروعات، تشكل الجداول الزمنية للتنفيذ السريع تحديات أمام تحقيق جميع الأنشطة المقررة. وكما ذكر سابقا، واجهت مشروعات في بعض الحالات أسعارا غير مستقرة للمدخلات في الأسواق، أو عدم القدرة على إكمال الأعمال بسبب صدمات سلسلة الإمداد. ومن التحديات الأخرى التي نشأت كان عدم المطابقة بين مواسم الأمطار أو الزراعة والتسليم المقرر المتوقع للمدخلات والمعدات - كما كان الحال في السودان. وأخيرا، في حالات أخرى، خططت المشروعات للربط بين توفير المدخلات بالتدريب أو بناء القدرات، ولكن كان عليها أن تتكيف بسبب ضيق الوقت.

43- ومن الواضح أنه من أجل الاستجابة لحالة الطوارئ، لا يمكن للدعم أن ينتظر. ومع ذلك، فقد يؤدي إنشاء روابط مع المبادرات الطويلة الأجل، والتنفيذ على مراحل، ومراعاة السياق، إلى دعم الفعالية والاستدامة. والدليل على ذلك هو التمديدات التي منحتها الجهات المانحة لمرفق تحفيز فقراء الريف، التي مكّنت المرفق في النهاية من دعم 19.2 مليون فرد من أفراد الأسر المعيشية بشكل مباشر.

الاستفادة من الخبرات

44- ما فتى الصندوق يستوعب هذه الدروس ويفكر فيها، وسيطبقها على استجابات أخرى. وكان هذا هو الحال بالنسبة لمبادرة الاستجابة للأزمات. وبالنسبة لهذه المبادرة، واصل الصندوق تبسيط عملية الموافقة مع الحفاظ في الوقت نفسه على الاستعراض المستقل لضمان الجودة. ورتب الصندوق أيضا دعمه بحسب الأولوية، مستهدفا البلدان الأكثر ضعفا البالغ عددها 22 بلدا بحد أدنى من التخصيص قدره 3 ملايين دولار أمريكي. وعلاوة على ذلك، صُممت مبادرة الاستجابة للأزمات بحيث ترتبط بمبادرات الصندوق الجارية والشركاء الموثوق بهم، وللإستفادة من العمليات القائمة التي وضعت في إطار مرفق تحفيز فقراء الريف. وفي حين أن الأنشطة لا تزال تُنفذ خلال فترة زمنية قصيرة (سنة واحدة) في إطار مبادرة الاستجابة للأزمات، فقد ارتبطت المشروعات ارتباطا وثيقا بمشروعات الاستثمار الأساسية في معظم الحالات، وهو ما يسمح بالاضطلاع بأنشطة تكميلية مستدامة طويلة الأجل.

رابعاً- الخطوات التالية

45- تنفيذ مرفق تحفيز فقراء الريف في أفغانستان واليمن. سيواصل الصندوق تنفيذ مشروع مرفق تحفيز فقراء الريف في أفغانستان والمكون الخاص بجائحة كوفيد-19 في مشروع تنمية سبل العيش الريفية في اليمن. وستواصل الإدارة رصد التقدم المحرز عن كثب، لا سيما بسبب الطابع الدقيق للتنفيذ في هذه السياقات. ومن خلال ضميمة لهذا التقرير، سيشارك الصندوق النتائج النهائية في أفغانستان واليمن مع الجهات المانحة بعد إغلاق هذين المشروعين.

46- إغلاق حسابات المنح المتبقية وتقديم التقارير المالية للجهات المانحة. سيضع الصندوق اللمسات الأخيرة على جميع الخطوات، بما في ذلك التحقق من المعلومات المتبقية المتعلقة بمراجعة الحسابات، من أجل إقفال حسابات المنح الفردية لمرفق تحفيز فقراء الريف.

47- مواصلة التفكير في تجارب الصندوق مع مرفق تحفيز فقراء الريف ومشاركة النتائج. حتى وقت كتابة هذا التقرير، كانت نتائج المرفق قد عُمت وجرت مشاركتها داخليا. ويخطط الصندوق أيضا لعقد حدث تعليمي

داخلي، يهدف تحديدا إلى مناقشة الدروس المستفادة من مرفق تحفيز فقراء الريف. وبالإضافة إلى ذلك، أطلق الصندوق، خلال الدورة الأولى لهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثالث عشر لموارد الصندوق، [موقعه الشبكي الخاص بالانتهاء من تنفيذ مرفق تحفيز فقراء الريف](#)، الذي يعرض بعض القصص والنتائج الرئيسية للمرفق. وسيواصل الصندوق أيضا نشر هذه القصص عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به. وأخيرا، وبالإضافة إلى ذلك، يقوم الصندوق بمشاركة التقرير النهائي المفصل مع الجهات المانحة، الذي شكل أساس هذا التحديث، ويظل مفتوحا لمشاركة الجهات المانحة.

إطار قياس نتائج مرفق تحفيز فقراء الريف

الأرقام الفعلية (تصنيفات حسب الإناث والشباب)	المجموعات المستهدفة (نسبة الإناث: الشباب)	المؤشرات	الهدف
<i>المستوى الأول: النتائج الإنمائية</i>			
النظر في العينة الكاملة لتقديرات مرفق تحفيز فقراء الريف، بما في ذلك الأسر المعيشية التي تقودها النساء والتي يقودها الشباب):	75 في المائة من الأسر المعيشية التي تتلقى دعماً من خلال الأنشطة التي يمولها مرفق تحفيز فقراء الريف (معرفة على أنها عدد الأشخاص الذين يتلقون دعماً)	(عدد) النسبة المئوية للأسر المعيشية التي أبلغت عن أنه قد جرى الحفاظ على ما يلي أو تحسينه:	التقليل إلى أدنى حد من آثار جائحة كوفيد-19 على سبل العيش والقدرة على الصمود والأمن الغذائي لدى المجموعة التي يستهدفها الصندوق، والحفاظ على التقدم المحرز في بلوغ المستويات المستهدفة أثر التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق
- قيمة الإنتاج: 74 في المائة (70 في المائة إناث، 73 في المائة شباب)		- قيمة الإنتاج	
- قيمة المبيعات في السوق: 60 في المائة (55 في المائة إناث، 61 في المائة شباب)		- قيمة المبيعات في السوق	
- دخل الأسرة المعيشية: 52 في المائة (50 في المائة إناث، 53 في المائة شباب)		- دخل الأسر المعيشية	
- التغذية/الأمن الغذائي: 77 في المائة (73 في المائة إناث، 74 في المائة شباب)		- الأمن التغذوي/الغذائي*	
- القدرة على الصمود: 70 في المائة (69 في المائة إناث، 69 في المائة شباب)		- القدرة على الصمود	
- ملكية الأصول: 66 في المائة (66 في المائة إناث، 64 في المائة شباب)		- ملكية الأصول	
-			
-			
<i>المستوى الثاني: نطاق الوصول وتقديم الخدمات</i>			
الركائز من 1 إلى 3: 1 164 049 (563 160 من الإناث؛ 379 544 من الشباب)	1.1 مليون – 6.9 مليون* (25:50:50) 0.5 مليون – 60 مليون* (25:50:50)	عدد الأشخاص الذين يتلقون دعماً من خلال الأنشطة التي يمولها المرفق في إطار الركائز من 1 إلى 3	نطاق الوصول العام
الركيزة 4:		عدد الأشخاص الذين يتلقون دعماً من خلال الأنشطة التي يمولها المرفق في إطار الركيزة 4	

التحديد الإنتاج أو إبرار الدخل أو بناء القدرات الزراعية أو المعلومات والخدمات المالية أكثر من 35 000 000 وصلوا عبر البث الإذاعي والبودكاست إلى المعلومات المتعلقة بالوقاية والتعافي من جائحة كوفيد-19			
881 503 (395 477 من الإناث؛ 255 902 من الشباب)	مُنتبَع (25:50:50)	عدد المنتجين الريفيين الذين يحصلون على مدخلات الإنتاج و/أو الحزم التكنولوجية (في ظل الظروف التي تنسم بالإجهاد/الاضطرابات)	الركيزة 1: توفير المدخلات والأصول الأساسية للإنتاج
236 615 (135 870 من الإناث؛ 105 517 من الشباب) وما لا يقل عن 450 منظمة من منظمات المنتجين	مُنتبَع (25:50:50)	عدد المنتجين الريفيين (ومنظمات المنتجين حيثما انطبق ذلك) الذين يتلقون دعماً لجمع، أو تخزين، أو نقل، أو بيع منتجاتهم (في ظل الظروف التي تنسم بالقيود/تدابير وبروتوكولات السلامة)	الركيزة 2: تيسير الوصول إلى الأسواق
5 813 233 دولاراً أمريكياً (وأكثر إلى وكالات أخرى مثل التعاونيات وما إلى ذلك) 72 647 (48 004 من الإناث؛ 20 356 من الشباب)	مُنتبَع (25:50:50)	قيمة الأموال المقدمة لمقدمي الخدمات المالية الريفية (في ظل الظروف التي تنسم بتعطل الأعمال أو مشاكل السيولة) بالدولار الأمريكي العدد المقدر للمنتجين الريفيين المستفيدين من قروض جديدة أو شروط محسنة للقروض القائمة من خلال مقدمي الخدمات المالية الريفية المدعومين**	الركيزة 3: توجيه الأموال للحفاظ على الخدمات والأسواق وفرص العمل للسكان الريفيين الفقراء
1 414 302 (302 449 من الإناث؛ 284 009 من الشباب) 2 508 847 (609 081 من الإناث؛ 617 182 من الشباب)	مُنتبَع (25:50:50) مُنتبَع (50:50:25)	عدد الأشخاص الذين حصلوا على تدريب عن بعد في ممارسات/تكنولوجيات الإنتاج أو في أنشطة أخرى مدرة للدخل عدد الأشخاص المتصلين بالمنصات الإلكترونية للحصول على المعلومات، وإرسال الأموال واستلامها والخدمات الرقمية الأخرى حيثما انطبق ذلك	الركيزة 4: تقديم المعلومات المتعلقة بالزراعة من خلال الخدمات الرقمية.

المستوى الثالث: الكفاءة والفعالية التشغيلية

النطاق	قيمة الأموال الموافق عليها	40 مليون دولار أمريكي – 250 مليون دولار أمريكي	89 مليون دولار أمريكي (100 في المائة من مجموع الأموال المتوفرة)
الإدماج الاجتماعي	النسبة المئوية للمشروعات الموافق عليها والتي تراعي المنظور الجنساني النسبة المئوية للمشروعات الموافق عليها والتي تراعي الشباب	100 في المائة 50 في المائة	53 في المائة 62 في المائة
سرعة استجابة الصندوق	متوسط الفترة الزمنية بين تقديم المشروع إلى لجنة استراتيجية العمليات وتوجيه السياسات وموافقة رئيس الصندوق*** متوسط الفترة الزمنية بين موافقة المجلس التنفيذي/رئيس الصندوق إلى أول صرف (أيام)	30 يوماً 30 يوماً	64 يوماً 217 يوماً
سرعة التنفيذ	معدل صرف الأموال في تاريخ الانجاز المقرر	100 في المائة	يُحدد لاحقاً

50		عدد المشروعات المنفذة من خلال الكيانات الحكومية	
14	مُنتبَع	عدد المشروعات المنفذة من خلال التعاون بين الأمم المتحدة/مع الوكالتين الأخريين اللتين تتخذان من روما مقرا لهما	الشراكات على المستوى القطري
16	مُنتبَع	عدد المشروعات المنفذة بالشراكة مع منظمات المزارعين أو المنظمات غير الحكومية أو القطاع الخاص	
92 في المائة	صُنِّفَت نسبة 90 في المائة على أنها مرضية إلى حد ما أو أفضل من ذلك	التصنيف العام للتقدم المحرز في التنفيذ بناء على آخر بعثة إشراف أو تقرير إنجاز	الأداء العام

* حُدِدَ هذا النطاق بافتراض أن المرفق سُبْعِيٌّ ما بين 40 مليون دولار أمريكي و250 مليون دولار أمريكي في شكل تمويل، وحسب طلب البلد.
 ** قد تشمل الشروط المحسنة تأجيل سداد القروض و/أو خفض الفائدة على القروض.
 *** باستثناء المشروعات التي تزيد على 10 ملايين دولار أمريكي وتتطلب موافقة المجلس التنفيذي.

لمحة عامة عن مشروعات مرفق تحفيز فقراء الريف

المشروعات المتعددة البلدان		
مليون دولار أمريكي	الركيزتان 1 و3. قدم الدعم المالي من خلال الأموال المتجددة. ووفر المدخلات الزراعية ودعم التسويق من خلال الشراكات بين المنتجين من القطاعين العام والخاص تتوسط فيها أو تنفذها منظمات المزارعين. من خلال ما مجموعه 231 منظمة من منظمات المزارعين، تلقى أكثر من 20 000 مزارع الأموال بشكل مباشر.	آسيا والمحيط الهادي: 8 بلدان ⁵ (مشروع قائم بذاته ينفذه الاتحاد الآسيوي للمزارعين من أجل التنمية الريفية المستدامة، وهو اتحاد جمعيات المزارعين)
مليون دولار أمريكي	الركائز من 1 إلى 4. عمل من خلال منظمات المزارعين لتكييف إنتاج الأغذية واستعادته من خلال دعم الوصول إلى المدخلات والمعلومات والأسواق والسيولة، بما في ذلك الأموال المتجددة، ونشر المعلومات بشأن توفر الأغذية وسلامتها. دعم نحو 220 000 أسرة معيشية. وبالإضافة إلى ذلك، دعمت إحدى منظمات المزارعين 127 بودكاست لمناقشة المسائل المتعلقة بجائحة كوفيد-19 داخل القطاع الزراعي-الرجعي-الرعي، ووصلت إلى ما يُقدر بنحو 30 مليون شخص.	أفريقيا الشرقية والجنوبية، وأفريقيا الغربية والوسطى: 21 بلدا ⁷ (مشروع قائم بذاته تنفذه منظمة المزارعين الأفارقة، وهي اتحاد جمعيات المزارعين)
2.9 مليون دولار أمريكي (بالإضافة إلى 0.5 مليون دولار أمريكي كتمويل مشترك)	الركيزة 1. وفر التمويل بمنح فرعية لمؤسسات البذور الرائدة والمزارعين الرئيسيين ومؤسسات البحوث لتوفير البذور وتدريب المستشارين المحليين الشباب على خدمات الإرشاد. دعم أكثر من 107 000 شخص.	القرن الأفريقي: جيبوتي وإريتريا والصومال وجنوب السودان (مشروع قائم بذاته تنفذه مجموعة نظم البذور، وهي منظمة غير حكومية)
1.5 مليون دولار أمريكي (بالإضافة إلى 0.9 مليون دولار أمريكي كتمويل مشترك)	الركيزتان 1 و4. التركيز على المناطق عبر الحدود، وزود منظمات الرعاة والرعاة الزراعيين بالعلف الحيواني والبذور المدعومة والخدمات البيطرية، ووفر الأبقار والمجترات الصغيرة (للقرعاء جدا). وساعد المشروع أيضا على إنشاء منصة رقمية لرصد وضع الرعاة وأثر جائحة كوفيد-19 عليهم، وللمساعدة على إرشاد عملية وضع السياسات وتعزيز إدماج هذه المجموعة في التشريعات الجديدة. دعم 180 000 شخص تقريبا.	بوركينافاسو ومالي والنيجر (مشروع قائم بذاته تنفذه شبكة Réseau Billital Maroobé، وهي شبكة لمنظمات المزارعين)
3.2 مليون دولار أمريكي (بالإضافة إلى 1.7 مليون دولار أمريكي كتمويل مشترك و0.5 مليون دولار من المنح العادية)	الركيزة 4. قدم المشورة الزراعية المخصصة من خلال تطبيقات على الهواتف المحمولة، وأنشأت قناة معلومات ذات اتجاهين يمكن للمزارعين من خلالها تلقي المشورة المنخفضة التكلفة لتحسين الممارسات الزراعية والوصول إلى الأسواق. ودعم أكثر من مليوني شخص.	كينيا ونيجيريا وباكستان (مشروع قائم بذاته تنفذه منظمة Precision Development)

⁵ القائمة الكاملة للبلدان: كمبوديا، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، ومنغوليا، ونيبال، وباكستان، والفلبين، وسري لانكا، وفيت نام.
⁶ تتمثل ركائز مرفق تحفيز سكان الريف فيما يلي: (1) توفير المدخلات والأصول الأساسية للإنتاج؛ (2) تيسير الوصول إلى الأسواق؛ (3) الأموال الموجهة للحفاظ على الخدمات والأسواق وفرص العمل للسكان الريفيين الفقراء؛ (4) تقديم المعلومات المتعلقة بالزراعة من خلال الخدمات الرقمية.

⁷ القائمة الكاملة للبلدان: الجزائر، وبنين، وبوركينا فاسو، وبوروندي، والكاميرون، وتشاد، والكونغو، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجيبوتي، وإسواتيني، وكينيا، وليسوتو، ومدغشقر، ومالي، وموريتانيا، والنيجر، ورواندا، والسنغال، وجنوب السودان، وتونس، وأوغندا، وجمهورية تنزانيا المتحدة.

<p>3 ملايين دولار أمريكي (بالإضافة إلى 3.7 مليون دولار أمريكي كتمويل مشترك)</p>	<p>الركائز 1 و 2 و 4. وفر المدخلات ورأس المال العامل لتجهيز الأراضي، والمعدات والتدريب لأغراض الإنتاج والتجهيز/التخزين ما بعد الحصاد. ودعم أيضا سلاسل الإمداد الممتثلة لإجراءات جانحة كوفيد-19، ودعم الحكومات في جمع البيانات عن آثار جائحة كوفيد-19 على الأمن الغذائي والضعف. ويسر كذلك توفير خدمات تنمية الأعمال وغيرها من أشكال الدعم للمؤسسات الصغيرة. وأنشأ المشروع أيضا منصات ولوحات مكرسة لجائحة كوفيد-19 لنشر المعلومات عن المعالم البارزة للتقدم وبيانات المخرجات الأنية والبيانات التي جمعت من مجموعة كبيرة من المصادر الخارجية بشأن إنتاج الأغذية واستهلاكها. ودعم المشروع أيضا وضع الحلول الرقمية المختبرة لروابط السوق وتوسيع نطاقها (بما في ذلك منصات التجارة الإلكترونية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة) والمشورة الزراعية والتوعية في مجال التغذية. وقدمت الأنشطة الدعم المباشر لأكثر من 33 000 شخص.</p>	<p>إقليم المحيط الهادي: فيجي وكيريباس وساموا وجزر سليمان وتونغا وفانواتو (مشروع قائم بذاته تنفذه وحدات إدارة المشروعات في مشروعات الصندوق في كل بلد من هذه البلدان)</p>
<p>2.5 مليون دولار أمريكي (بالإضافة إلى 0.1 مليون دولار أمريكي كتمويل مشترك)</p>	<p>الركيزة 4. أنشأ خدمات رقمية واسعة النطاق لمنظمات المنتجين والمصارف المجتمعية الريفية، إلى جانب أنشطة تتضمن توفير المعدات والتدريبات الملائمة؛ وربط منظمات المنتجين والمؤسسات المتوسطة والصغيرة بالمشتريين من القطاع الخاص، وزيادة قدراتها المتعلقة بالتجارة الإلكترونية؛ ومساعدة المجموعات على إعداد إجراءات وبروتوكولات معتمدة بشأن السلامة البيولوجية وإدارة المخاطر؛ وتزويد مقدمي الخدمات المالية المحليين بالتكنولوجيات الرقمية لضمان استمرارية الأعمال. وقدم الدعم المباشر إلى ما يُقدر بنحو 32 000 مزارع من المزارعين الأسريين.</p>	<p>دولة بوليفيا المتعددة القوميات وغواتيمالا وهايتي وهندوراس وبيرو (مشروع قائم بذاته تنفذه منظمة Agriterra، وهي منظمة غير حكومية)</p>
<p>2.5 مليون دولار أمريكي (بالإضافة إلى 0.1 مليون دولار أمريكي كتمويل مشترك ومليون دولار أمريكي كمنح عادية)</p>	<p>الركيزتان 3 و 4. وفر الدعم المالي والتقني لشركات التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الزراعية بهدف تكيف نماذج أعمالها وتلبية احتياجات صغار المنتجين الريفيين، بما في ذلك التعاونيات ومنظمات المنتجين، وخصوصا النساء والشباب والشعوب الأصلية. وفي وقت الانتهاء من تنفيذ مرفق تحفيز فقراء الريف، قدم الدعم المباشر لأكثر من 3400 شخص وأسرهم المعيشية. وبالنظر إلى استمرار تنفيذ المشروع بتمويل مشترك، سيُقدم الدعم إلى ما يُقدر بنحو 10 000 شخص من أصحاب الحيازات الصغيرة.</p>	<p>دولة بوليفيا المتعددة القوميات والسلفادور وهايتي وهندوراس وغواتيمالا والمكسيك (مشروع قائم بذاته تنفذه Sparkassenstiftung für Internationale Kooperation، وهي منظمة غير حكومية)</p>
<p>1.5 مليون دولار أمريكي</p>	<p>الركيزتان 1 و 2: حسّن الاستجابة للاضطرابات التجارية الحدودية على طول الممر الشمالي من خلال التبادل الفعال للمعلومات وتنسيق الأنظمة الحدودية؛ وتدريب منظمات المزارعين والمؤسسات البالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة لزيادة القدرة التفاوضية الجماعية؛ ووفر مدخلات تكنولوجية والدعم اللوجستي ودعم التخزين لمنظمات المزارعين والمؤسسات البالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة (بما يشمل إنشاء مراكز تجميع ريفية). ودعم أكثر من 1300 شخص.</p>	<p>المؤسسات البالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة في أفريقيا الشرقية: بوروندي، وكينيا، ورواندا، وجنوب السودان، وأوغندا (مشروع قائم بذاته تنفذه هيئة تنسيق العبور والنقل في الممر الشمالي)</p>
<i>المشروعات الخاصة ببلد واحد</i>		
<p>1.5 مليون دولار أمريكي</p>	<p>الركيزتان 1 و 2. وفر المدخلات والأصول الأساسية للنظافة الصحية للماشية ولإنتاج، وقدم الدعم الإضافي من خلال الوحدات الميدانية البيطرية، وحملات التلقيح؛ ويوفر التدريب والإرشاد في المجال البيطري. المشروع جارٍ.</p>	<p>أفغانستان (مشروع قائم بذاته نفذته في السابق اللجنة الهولندية لأفغانستان، وحل محل مشروع مرفق تحفيز فقراء الريف</p>

		المنفذ للمشروع المجتمعي للزراعة والثروة الحيوانية الذي يموله الصندوق.
1.4 مليون دولار أمريكي	الركيزة 1. وفر، على وجه التحديد، مدخلات تغذوية كثيفة وأدوات زراعية للأسر المعيشية الضعيفة المتأثرة من أزمة جائحة كوفيد-19، وكذلك من الكوارث الطبيعية. ووصل إلى ما يقرب من 80 000 فرد من أفراد الأسر المعيشية.	أنغولا (ينفذ مشروع تنمية زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة وإضفاء الطابع التجاري عليها في محافظتي كوانزاسول وهويلا)
مليون دولار أمريكي (بالإضافة إلى 0.2 مليون دولار أمريكي كتمويل مشترك)	الركيزتان 1 و2. توفير المدخلات ذات الأثر السريع ودعم بناء القدرات من أجل زراعة الخضروات المنزلية العالية القيمة والغنية بالمغذيات في المناطق الساحلية والتدريب على أنشطة ما بعد الحصاد. ودعم 55 000 شخص تقريبا.	بنغلاديش (ينفذ مشروع القدرة التنافسية الزراعية لأصحاب الحيازات الصغيرة)
مليون دولار أمريكي (بالإضافة إلى 0.2 مليون دولار كتمويل مشترك)	الركيزتان 1 و2. دعم سلاسل القيمة الخاصة بالأرز من خلال توفير المدخلات بما في ذلك حزم الإنتاج، والآلات للإنتاج، والدراجات الثلاثية العجلات لنقل السلع إلى الأسواق، وآلات التجهيز لما بعد الحصاد. ودعم 3 315 شخصا.	بنن (ينفذ مشروع دعم الوصول إلى الأسواق والتنمية الزراعية)
1.5 مليون دولار أمريكي	الركائز 1 و2 و4. وفر المدخلات المدعومة (بما في ذلك البذور المقاومة لتغير المناخ) والمعدات والتدريب والإرشاد لخدمات المعلومات الرقمية لحدائق السوق خلال موسم الجفاف. وأنشأ منصة تسويق رقمية ومركز اتصال للمعلومات عن السوق، وتعزيز الشراكات على طول سلاسل القيمة الخاصة بالخضروات. ودعم أكثر من 8000 شخص.	بوركينافاسو (ينفذ مشروع تعزيز سلاسل القيمة الزراعية)
1.6 مليون دولار أمريكي (بالإضافة إلى 0.3 مليون دولار أمريكي كتمويل مشترك)	الركيزة 1. وفر حزم مدخلات تضم بذورا هجينة أو بذورا وأسمدة ومنتجات حماية النباتات، ومستلزمات بيطرية، وأعلاف، ومضخات رش الخنازير. وعقدت حلقات عمل للتواصل بشأن جائحة كوفيد-19، وبثت وسائل الإعلام المحلية رسائل توعية. ودعم أكثر من 87 000 شخص.	بوروندي (ينفذ برنامج تنمية سلاسل القيمة – المرحلة الثانية)
1.2 مليون دولار أمريكي (بالإضافة إلى 0.4 مليون دولار أمريكي كتمويل مشترك)	الركائز 1 و2 و4. حدث وطبق حلا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات القائمة، وهو تطبيق Chamka، لدعم الأسر المعيشية الريفية/النائية؛ وكثف إنتاج الخضروات والدواجن في الفناء الخلفي؛ وأدخل التدريب الإلكتروني في ممارسات/تكنولوجيات الإنتاج. ودعم 6 737 شخصا.	كمبوديا (ينفذ برنامج الخدمات الزراعية المعنية بالابتكارات والقدرة على الصمود والإرشاد)
1.1 مليون دولار أمريكي (بالإضافة إلى 50 000 كتمويل مشترك)	الركائز 1 و2 و4. وفر المدخلات والآلات والمساعدة التقنية لإنتاج المحاصيل والإنتاج الحيواني. ودعم الوصول إلى الأسواق من خلال إنشاء أسواق مؤقتة، والمساعدة في التخزين، والتواصل مع المشترين من خلال منصات رقمية. ودعم 1500 شخص، كان 80 في المائة منهم من الشباب.	الكاميرون (ينفذ برنامج تشجيع المشروعات الزراعية الرعوية للشباب)
1.4 مليون دولار أمريكي (بالإضافة إلى 0.3 مليون دولار أمريكي كتمويل مشترك)	الركيزة 1. ساعد على اقتناء وتوزيع مدخلات الإنتاج النباتي والإنتاج الحيواني؛ وحسن قدرات معهد أفريقيا الوسطى للبحوث الزراعية على إنتاج البذور؛ ونظف الأراضي الزراعية وحرثها، من خلال بناء قدرات منظمات المنتجين على الإدارة وتعزيز تكنولوجيات الإنتاج. ووصل إلى 2 360 أسرة معيشية.	جمهورية أفريقيا الوسطى (ينفذ مشروع تنشيط الإنتاج الزراعي والحيواني في مناطق السافانا)

1.8 مليون دولار أمريكي (بالإضافة إلى 0.1 مليون دولار أمريكي كتمويل مشترك)	الركيزتان 1 و2. وفر مدخلات مثل البذور وأنواع البذور المحسنة والأسمدة والمعدات الزراعية الصغيرة ومعدات ضخ المياه والمدخلات البيطرية والمضخات الآلية والدراجات ثلاثية العجلات. ودعم بناء الآبار، وتطوير مواقع البستنة في الأسواق، ومواقع الزراعة البعلية والركود الفيضي، وقدم التدريب في مجالات مثل الإنتاج الزراعي، وإكثار البذور وصيانة المعدات. ووصل إلى أكثر من 8 600 أسرة معيشية.	تشاد (ينفذه مشروع تعزيز إنتاجية وسمود المزارع الأسرية والزراعة الرعوية)
0.6 مليون دولار أمريكي	الركيزتان 1 و2. زود منظمات صغار المزارعين ومربيي الحيوانات المجتررة بمعدات الإنتاج ومعدات ما بعد الحصاد ومجموعات التلقيح لتوسيع نطاق الأراضي المزروعة وتجهيزها، وتحسين الحالة المناخية للحيوانات وقدرتها على الصمود. وركز أيضا على التدريب على استخدام وصيانة المواد. ووصل إلى 60 284 أسرة معيشية.	كوت ديفوار (ينفذه برنامج دعم تنمية سلاسل القيمة الزراعية)
0.7 مليون دولار أمريكي	الركيزة 1. وفر مدخلات مثل بذور الأرز المحسنة والأسمدة، ووفر أيضا التدريب على الممارسات الزراعية الجيدة. ووصل إلى 1 137 أسرة معيشية.	كوت ديفوار (ينفذه مشروع دعم الطوارئ الزراعية)
0.3 مليون دولار أمريكي	الركيزتان 1 و2. وفر المدخلات والتدريب، بالشراكة مع مؤسسات البحوث المحلية، من أجل تدوير المحاصيل واستخدام الأصناف المحسنة. وأيضاً حدث البنية التحتية السوقية المختارة للتخزين والمبيعات والنقل في المناطق الريفية وشبه الحضرية. وصل إلى أكثر من 1 100 أسرة معيشية.	جزر القمر (ينفذه مشروع دعم إنتاجية المزارع الأسرية وقدرتها على الصمود)
مليون دولار أمريكي (بالإضافة إلى 0.3 مليون دولار أمريكي كتمويل مشترك)	الركيزة 1. عمل من خلال منظمات المنتجين لدعم زراعة المحاصيل وتربية الماشية والأحياء المائية من خلال توفير المدخلات (بما في ذلك بذور الخضروات المقاومة لتغير المناخ والإصبيات والصيصان والأعلاف والمنتجات البيطرية)؛ والتدريب على ممارسات الإنتاج المكيفة. وقدم الدعم المباشر لأكثر من 3 900 شخص.	الكونغو (ينفذه مشروع تنمية مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية الداخلية)
المنحة الأولى: 1.2 مليون دولار أمريكي (بالإضافة إلى 0.2 مليون دولار أمريكي كتمويل مشترك) المنحة الثانية: 1.5 مليون دولار أمريكي (بالإضافة إلى 0.3 كتمويل مشترك)	الركائز 1 و2 و4. عمل من خلال منظمات المزارعين على توفير المدخلات والتدريب على ممارسات الإنتاج المكيفة. ودعم الوصول إلى الأسواق من خلال توفير وسائل النقل وتحسين الأسعار ونظم المعلومات عن السوق. ودعم أكثر من 12 500 شخص.	جمهورية الكونغو الديمقراطية (نفذت المنحة الأولى من خلال مشروع دعم القطاع الزراعي في مقاطعة شمال كيفو، ونفذت المنحة الثانية من خلال برنامج دعم التنمية الريفية الشمولية والصامدة)
0.4 مليون دولار أمريكي	الركيزة 1. وفر مدخلات مختلفة لمنتجي المحاصيل والماشية والأسماك بما في ذلك البذور (البذور العلفية لتجديد الغطاء النباتي وبذور الخضروات لزراعة الباحات الخلفية)، والأسمدة ومنتجات حماية المحاصيل وحجارة اللعق للماشية والمنتجات البيطرية؛ وشباك صيد الأسماك. ودعم 1 938 أسرة معيشية.	جيبوتي (ينفذه برنامج إدارة التربة والمياه)
0.3 مليون دولار أمريكي	الركيزة 1. وزع بذور الطوارئ للمزارعين الذين فقدوا محاصيلهم وكانوا عرضة للمزيد من الضعف بسبب عدم قدرتهم على الوصول إلى الأسواق المفتوحة وموردي البذور التقليديين. ووصل إلى 4 800 منتج.	إريتريا (ينفذه المشروع الوطني للزراعة)

<p>0.3 مليون دولار أمريكي (بالإضافة إلى 0.2 مليون دولار أمريكي كتمويل مشترك)</p>	<p>الركائز 1 و 2 و 4. وفر تمويلا مشتركا لمشروع منظمة الأغذية والزراعة/برنامج الأغذية العالمي الممول من صندوق الأمم المتحدة للاستجابة لجائحة كوفيد-19 والتعافي من أثارها. ووفر المشروع المدخلات وعزز الروابط بالسوق من خلال التوعية والتدريب على تطبيق نظام معلومات السوق الزراعية المنفتح، وهو نظام تسويق رقمي لتيسير تسويق الخضروات البستانية. وأشرك أيضا شركات النقل لربط المزارعين بالأسواق، وعزز التوعية بجائحة كوفيد-19. ودعم أكثر من 3 400 شخص.</p>	<p>إسواتيني (مشروع قائم بذاته تنفذه منظمة الأغذية والزراعة)</p>
<p>0.4 مليون دولار أمريكي (بالإضافة إلى 0.7 مليون دولار كتمويل مشترك)</p>	<p>الركائز 1 و 2 و 4. وفر الدعم لمدخلات الإنتاج لزراعة الخضروات الغنية بالمغذيات مع الدعم التقني للإنتاج وتعزيز الابتكارات والممارسات الزراعية الذكية بينيا. ووفر أيضا التدريب في مجال التوعية بجائحة كوفيد-19، وحسن منصات التسويق الإلكتروني الرقمي الحالية. ودعم ممارسات ما بعد الحصاد من خلال توفير المجففات الشمسية وتدريب المزارعين على استخدامها (بالاستعانة بالمدرسين الشباب). ووصل إلى أكثر من 1 600 شخص.</p>	<p>إسواتيني (ينفذه المشروع الذي توجهه السوق لصالح أصحاب الحيازات الصغيرة)</p>
<p>2.2 مليون دولار أمريكي (بالإضافة إلى مليوني دولار أمريكي كتمويل مشترك)</p>	<p>الركائز 1 و 2 و 4. من خلال أنظمة القسام، جرى تزويد المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة بإمكانية الحصول على البذور المحسنة والأسمدة والمجترات والمواقد وغير ذلك؛ ووفر خدمات استشارية إرشادية. ووفر فرص عمل للشباب، بما في ذلك إنتاج شتلات الحضانة وإعادة تأهيل الأخاديد، ودعم نقل منتجات سلسلة القيمة من المزارع إلى التعاونيات. وأسس أيضا 29 مرفق تخزين. واستهدف الوقاية من جائحة كوفيد-19 من خلال التدريب على السلامة والمعدات، والبيث الإذاعي في المزارع بمعلومات عن الجائحة. ودعم 70 000 أسرة معيشية تقريبا، ووصل إلى ما يُقدر بنحو 4.5 مليون شخص من خلال البيث الإذاعي.</p>	<p>إثيوبيا (ينفذه برنامج التنمية التشاركية للري على نطاق صغير – المرحلة الثانية)</p>
<p>0.4 مليون دولار أمريكي</p>	<p>الركيزة 1. دعم تعاونيات تربية الدواجن والمزارعين من مربي الخنازير والأغنام بالمدخلات (بما في ذلك الأعلاف والحظائر وغيرها من المعدات) والتدريب على ممارسات الإنتاج المكيفة. وصل إلى 243 أسرة معيشية.</p>	<p>غابون (ينفذه مشروع التنمية الزراعية والريفية – المرحلة الثانية)</p>
<p>0.6 مليون دولار أمريكي</p>	<p>الركائز 1 و 2 و 4. التركيز على النساء والشباب الذين يعملون في حدائق الخضروات، وتوفير المدخلات الخاصة بالمحاصيل والثروة الحيوانية والتحويلات النقدية الرقمية؛ ودعم النقل الآمن والصحي إلى الأسواق وتوفير المعدات لضمان استمرار إمكانية عمل جميع الجهات الفاعلة في السوق. وطور أدوات اتصال رقمية متعدد الأغراض لتوفير المعلومات عن السوق والتدريب واستخدامات أخرى. ودعم أكثر من 20 000 شخص.</p>	<p>غامبيا (ينفذه برنامج صمود المنظمات لأغراض الزراعة التحويلية لأصحاب الحيازات الصغيرة)</p>
<p>1.2 مليون دولار أمريكي</p>	<p>الركائز من 1 إلى 3. عمل من خلال منظمات المزارعين ووفر حزم الإنتاج بالشراكة مع الموردين من القطاع الخاص، إلى جانب معدات الإنتاج والحماية، وتقديم المساعدة التقنية والتدريب على ممارسات الإنتاج المكيفة والتسويق والمعلومات عن السوق، ووفر معدات النقل، وضح الأموال لصالح مقدمي الخدمات المالية المحليين. ودعم أكثر من 7 600 شخص.</p>	<p>غينيا (ينفذه مشروع الزراعة الأسرية والقدرة على الصمود والأسواق في غينيا العليا والوسطى)</p>
<p>0.8 مليون دولار أمريكي</p>	<p>الركيزتان 1 و 2. وفر المدخلات والمساعدة التقنية والتدريب ومعدات الحماية وحزم النظافة الصحية، وأعد برامج إذاعية وطنية لتقديم معلومات عن أسعار السوق والعرض والطلب المتعلقة بسلاسل قيمة محددة. ووصل إلى أكثر من 2800 شخص.</p>	<p>غينيا بيساو (ينفذه مشروع التنمية الاقتصادية في المناطق الجنوبية)</p>

1.9 مليون دولار أمريكي (بالإضافة إلى 0.9 مليون دولار أمريكي كتمويل مشترك)	الركائز 1 و2 و4. ركز على مزارعي البطاطا ووفر القسائم الإلكترونية للمدخلات والتدريب على الممارسات المكيفة والمعلومات الرقمية عن الطقس وتقنيات تعزيز الإنتاج. وأيضا تيسير التسويق الجماعي وتوفير الدعم في مجال التخزين، وربط المزارعين بمنصات السوق الرقمية. ووصل إلى نحو 8 150 من صغار المزارعين.	كينيا (مشروع قائم بذاته تنفذه وزارة الزراعة والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك والتعاونيات)
0.2 مليون دولار أمريكي	الركيزة 1. وفر المدخلات لـ 580 منتجا من منتجي محاصيل البيوت الزجاجية، بما في ذلك الأغذية البلاستيكية لجمع مياه الأمطار.	لبنان (مشروع قائم بذاته ينفذه مشروع الزراعة الذكية مناخيا: مشروع تعزيز قدرة المجتمعات الريفية على التكيف في لبنان، الذي يموله صندوق التكيف ويشرف عليه الصندوق)
0.7 مليون دولار أمريكي (بالإضافة إلى 0.4 مليون دولار أمريكي كتمويل مشترك)	الركيزة 1. وفر المدخلات لـ 12 800 مزارع من مزارعي الصوف والموهير، وخاصة مدخلات الإنتاج لتغذية الحيوانات حفاظا على حجم القطعان وجودتها.	ليسوتو (مشروع قائم بذاته تنفذه وزارة الزراعة والرابطة الوطنية لمزارعي الصوف والموهير في ليسوتو)
1.1 مليون دولار أمريكي	الركيزة 1. وفر المدخلات والمعدات والتدريب لإنتاج الأرز والكسافا والخضروات للمزارعين والتعاونيات. ودعم أكثر من 12 000 شخص.	ليبيريا (ينفذه مشروع الإرشاد بشأن محاصيل الأشجار)
1.8 مليون دولار أمريكي	الركائز من 1 إلى 4. وفر البذور، وساعد في أنشطة ما بعد الحصاد والتسويق من خلال دعم إعادة تأهيل وبناء ومستودعات وأكشاك التخزين. وقدم المشروع أموالا متجددة. ودعم إنشاء منصة لإدارة المعلومات وساعد على إنشاء "فرقة عمل معنية بالرقمنة" لتنسيق هذه المنصة. ودعم 13 160 فردا.	مدغشقر (مشروع قائم بذاته تنفذه وزارة الزراعة والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك)
1.5 مليون دولار أمريكي (بالإضافة إلى 0.2 مليون دولار أمريكي كتمويل مشترك)	الركائز 1 و2 و4. وفر مدخلات زراعية بالتعاون مع مورد خاص؛ وقدم خدمات إرشاد إلكترونية ومعلومات زراعية رقمية، ودعم الحكومة من أجل اعتماد البذور. ونفذ برنامجا لنقل الماشية. ودعم 43 600 شخص.	ملاوي (ينفذه برنامج الإنتاج الزراعي المستدام)
1 مليون دولار أمريكي	الركيزتان 1 و4. قدم الدعم للشباب من خلال توفير مدخلات مثل الأعلاف والدواجن ومدخلات التسويق وغير ذلك. ووفر الهواتف، وربط الشباب بالمنصات الزراعية الرقمية، ودرّب القادة على تقنيات التجارة الإلكترونية. ووصل إلى أكثر من 8 300 شاب.	مالي (ينفذه مشروع التدريب المهني لشباب الريف، ودعم العمالة وريادة الأعمال)
0.7 مليون دولار أمريكي	الركيزتان 1 و4. وفر بذور مرخصة مقاومة لتغير المناخ، ومعدات، ومدخلات خاصة بالثروة الحيوانية، وخدمات بيطرية ودعم تقني وتدريب على الإنتاج. وقدم أيضا معلومات بشأن توفر المدخلات والخدمات البيطرية ومعلومات السوق عن طريق الإذاعة والرسائل النصية والمنصات الرقمية. ودعم 65 000 شخص تقريبا.	موريتانيا (ينفذه مشروع الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية والمعدات المشاع وتنظيم المنتجين الريفيين)
1.7 مليون دولار أمريكي (بالإضافة إلى 0.9 مليون دولار أمريكي كتمويل مشترك)	الركائز 1 و2 و4. قدم مجموعة من أشكال الدعم، بما في ذلك المدخلات الغنية بالمغذيات، والتثقيف بشأن التغذية، والنظافة الصحية للماشية، ومواد الدعم لمحو الأمية المالية، والوصول إلى خدمات المعلومات الرقمية والتعلم الإلكتروني. ودعم أكثر من 12 000 شخص.	موزامبيق (ينفذه برنامج تنمية سلاسل القيم الزراعية الغذائية الشمولية)

1.2 مليون دولار أمريكي	الركائز 2 و3 و4 دعم المصارف المحلية لتوسيع نطاق خدماتها الرقمية، وتنفيذ تطبيق جديد لبطاقات الائتمان على الهواتف المحمولة يتيح تحويل الأموال والمعلومات والمعالجة المؤتمتة للقروض. وعزز التثقيف المالي ومحو الأمية التجارية، والقدرة على معالجة القروض، وخدمات السوق الرقمية، وقدرة الحكومة المحلية على التخطيط والإرشاد. ودعم أكثر من 36 000 أسرة معيشية.	نيبال (مشروع قائم بذاته ينفذه مصرف التنمية الزراعية المحدود)
1.5 مليون دولار أمريكي	الركيزتان 1 و2 . وفر المدخلات بما في ذلك البذور ومعدات ضخ المياه، إلى جانب معدات تجهيز المنتجات الزراعية وحفظها. ودعم أكثر من 16 000 شخص.	النيجر (ينفذه برنامج تنمية الزراعة الأسرية في مناطق مارادي وتاهوا وزيندر)
0.9 مليون دولار أمريكي (بالإضافة إلى 1.3 مليون دولار أمريكي من الأموال المعاد توجيهها من برنامج التأقلم مع تغير المناخ ودعم الأعمال الزراعية)	الركيزة 1 . من خلال منظمات المزارعين، سلم حزم تشمل مدخلات ومنتجات مصممة خصيصا، بما في ذلك البذور المقاومة لتغير المناخ وذات الغلة العالية والقصيرة الأمد والقيمة الغذائية العالية، والأسمدة ومضخات المياه. ودعم 334 8 شخصا.	نيجيريا (ينفذه برنامج التأقلم مع تغير المناخ ودعم الأعمال الزراعية في حزام السافانا)
1.1 مليون دولار أمريكي	الركيزة 1 . وفر للمزارعين مدخلات إنتاجية عالية الجودة مثل البذور المحسنة والأسمدة، بالإضافة إلى التدريب على الممارسات الزراعية. ودعم أكثر من 3 330 شخص.	نيجيريا (ينفذه برنامج تنمية سلاسل القيمة)
2.4 مليون دولار أمريكي	الركائز من 1 إلى 4 . أسس وعزز القدرات لمصارف الأغذية المجتمعية، وزود المجتمعات بالمدخلات (القمح، والدواجن، ووحدات التفرغ، ولوازم بستنة المطابخ، والحضانات)، ودعم أنشطة التدريب ذات الصلة، وقدم أيضا منح نقدية للمستفيدين الذين يتلقون تدريباً مهنياً أو مؤسسياً من المشروع الأساسي. ودعم ما يقرب من 28 000 شخص.	باكستان (مشروع قائم بذاته مع وزارة التخطيط والتنمية والمبادرات الخاصة)
0.6 مليون دولار أمريكي (بالإضافة إلى 60 000 دولار أمريكي كتمويل مشترك)	الركيزة 1 . وزع البذور والأسمدة على صغار المنتجين ودعم تجميع المحاصيل وربط المزارعين بالمشتريين. واستفادت منه أكثر من 3 500 أسرة من الأسر المعيشية لأصحاب الحيازات الصغيرة.	فلسطين (ينفذه مشروع إدارة الأراضي والموارد لمواجهة تغير المناخ)
0.7 مليون دولار أمريكي	الركائز من 1 إلى 4 . وفر المدخلات والبذور للمزارعين، ودعم الاستثمارات لإعادة تأهيل أسطولي نقل من الشركاء الرئيسيين (ودعم الشركاء الرئيسيين في تعبئة تمويل القروض من أحد المصارف الوطنية)، وضمن نشر أسعار السوق. ودعم أكثر من 3000 شخص.	بابوا غينيا الجديدة (مشروع قائم بذاته تنفذه وكالة تنمية المنتجات الطازجة ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية)
1.4 مليون دولار أمريكي (بالإضافة إلى 0.5 مليون دولار أمريكي كتمويل مشترك)	الركيزتان 1 و2 . وفر بذور الذرة والفاصولياء والبطاطا إلى جانب الأسمدة، ودعم الوصول إلى الأسواق من خلال توفير عمليات شراء مضمونة للحبوب، بالإضافة إلى مرافق التخزين. وقدم الدعم المباشر لـ 48 000 شخص.	رواندا (مشروع قائم بذاته ينفذه مجلس تنمية الزراعة والموارد الحيوانية في رواندا)

0.4 مليون دولار أمريكي	الركيزتان 1 و 2. وفر مدخلات من بذور وأسمدة ومواد نباتية وأكياس بيولوجية للنقل وناموسيات ولوازم الزراعة في الصوبات الزراعية. ودعم المركز الدولي للزراعة الاستوائية لضمان توفير مواد نباتية عالية الجودة، بما في ذلك لإجراء الاختبارات. وشجع تربية الدواجن من خلال (1) توزيع الكتاكيت وأعلاف الدواجن على المزارعين؛ (2) تدريب المربين على تقنيات الأمن البيولوجي؛ (3) توفير المنتجات البيطرية. ووصل إلى 200 أسرة معيشية.	سان تومي وبرينسيبي (ينفذه مشروع دعم التسويق والإنتاجية الزراعية والتغذية)
1.1 مليون دولار أمريكي	الركيزتان 1 و 2. وفر المدخلات المدعومة والمعدات الصغيرة لمنتجات البطاطا والبطيخ؛ وقدم أنشطة بناء القدرات والدعم الاستشاري لمجموعات المنتجين بشأن ممارسات الإنتاج المكيف لمحاصيل البستنة والأسواق. ودعم أكثر من 2 500 شخص.	السنغال (ينفذه مشروع دعم إدماج الشباب الريفيين أصحاب المبادرات الزراعية)
1.1 مليون دولار أمريكي	الركيزتان 1 و 2. وفر المدخلات (بما في ذلك البذور السريعة النمو والعالية المردود) وآلات تجهيز الأراضي، ودعم تحسين الروابط بالأسواق. ودعم أكثر من 2500 شخص.	سيراليون (ينفذه مشروع تنمية سلاسل القيمة الزراعية)
2.8 مليون دولار أمريكي (بالإضافة إلى 0.3 مليون دولار أمريكي كتمويل مشترك)	الركيزتان 1 و 2. وفر المدخلات والمعدات الثانوية للإنتاج المحصولي والحيواني والسمني، والمعدات والتدريب لتقليص خسائر ما بعد الحصاد إلى أدنى حد ممكن وإضافة القيمة. ونظم عمليات الشراء المحلية من مجموعات صغار المزارعين. ودعم أكثر من 4 300 مستفيد.	الصومال (مشروع قائم بذاته ينفذه معهد التنمية والصمود في الصومال)
1.4 مليون دولار أمريكي	الركيزتان 1 و 2. وفر مدخلات مثل البذور ومعدات ومرافق ما بعد الحصاد (الدراسات، والصوامع، والأكياس المحكمة الإغلاق، والتخزين، والمبردات، وما إلى ذلك). ودعم 15 739 شخصا.	جنوب السودان (مشروع قائم بذاته تنفذه جمعية أطباء بيطريون بلا حدود - ألمانيا، وهي منظمة غير حكومية)
1.7 مليون دولار أمريكي (بالإضافة إلى 0.1 مليون دولار أمريكي كتمويل مشترك)	الركائز 1 إلى 4. وفر مدخلات الإنتاج لصغار المزارعين، بما في ذلك بذور الخضروات للنساء لاستخدامها في الحدائق المنزلية، بالإضافة إلى التدريب على الممارسات المكيفة للإنتاج وممارسات ما بعد الحصاد والإدارة المالية. ووفر أكياس التخزين المحكمة الإغلاق ودعم مراكز التجميع ودعم تقديم الإرشاد الإلكتروني ونشر معلومات لإنتاج والسوق عن طريق الرسائل النصية القصيرة والإذاعة. وضخ الأموال لصالح مقدمي الخدمات المالية المحليين لزيادة الحصول على الائتمان والقدرة على إرسال الأموال وتلقيها. ودعم ما يقرب من 12 000 شخص.	السودان (مشروع قائم بذاته تنفذه وزارة الزراعة وصحة الحيوان والري)
0.5 مليون دولار أمريكي	الركيزة 1. وفر النعاج الحوامل والعلف الحيواني إلى جانب البذور وغيرها من المدخلات الأساسية والأدوات الزراعية. ودعم 659 شخصا ضعيفا.	الجمهورية العربية السورية: (مشروع قائم بذاته ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)
مليون دولار أمريكي	الركائز 1 و 2 و 4. دعم منظمات صغار المزارعين للوصول إلى مدخلات مثل البذور والأسمدة. ودعم أيضا شراء الحكومة لحبوب الذرة من صغار المزارعين وربط منظمات المزارعين بالمشتريين وطور تطبيقا على الهواتف النقالة يتيح الحصول على معلومات عن السوق بشأن المدخلات والمبيعات والتدريب. ودعم أكثر من 14 000 شخص.	جمهورية تنزانيا المتحدة (مشروع قائم بذاته تنفذه وزارة الزراعة)
مليون دولار أمريكي	الركيزة 1. دعم مزارعي الخضروات بالمدخلات (بما ذلك حزم الري) والتدريب. ودعم أكثر من 1 800 شخص.	توغو (ينفذه مشروع دعم آلية توفير الحوافز لتشاطر المخاطر في التمويل الزراعي)

أوغندا (مشروع قائم بذاته تنفذه وحدة إدارة مشروع الشمول المالي في المناطق الريفية)	الركيزة 3. دعم مجموعات الائتمان والادخار المحلية والأعضاء فيها من خلال تقديم المنح النقدية مصحوبة بمساعدة في بناء القدرات في مجال الإدارة، والإرشاد المتعلق بالتكنولوجيات الرقمية لإدارة المجموعات، وقدم التدريب على محو الأمية المالية. ودعم أكثر من 30 000 عضو.	2.1 دولار أمريكي (بالإضافة إلى 0.2 مليون دولار أمريكي كتمويل مشترك)
اليمن (مشروع قائم بذاته ينفذه الصندوق الاجتماعي للتنمية)	الركيزة 1. وفر، حسب الحاجة، المدخلات والأصول المجانية لمحاصيل البستنة والإنتاج الحيواني، إلى جانب التدريب على ممارسات الإنتاج المكيفة. ودعم 1400 شخص تقريبا.	0.8 مليون دولار أمريكي (بالإضافة إلى 11 000 كتمويل مشترك)
اليمن (نصف كمشروع تنمية سبل العيش الريفية، من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية)	الركيزتان 1 و2. يوفر المدخلات والمعدات الإنتاجية والمواد البيطرية والتدريب والمدخلات لعمليات ما بعد الحصاد. المشروع جارٍ.	3 ملايين دولار أمريكي
زامبيا (ينفذه البرنامج المعزز للاستثمار في الثروة الحيوانية لأصحاب الحيازات الصغيرة)	الركيزتان 1 و4. وفر التدريب البيطري عن بُعد والرسائل المتعلقة بجائحة كوفيد-19، إلى جانب خدمات بيطرية أخرى. وأنشأ منصة إلكترونية للمراقبة وتبادل المعلومات من أجل الوقاية من الأمراض الحيوانية، إلى جانب حزم الحيوانات من الأرانب والدجاج والماعز، والأبار المجهزة بالطاقة الشمسية لغسل الأيدي، وأقفاص الأرانب. ودعم أيضا تطوير نظام للتأمين مرتبط بمؤشر الثروة الحيوانية. ودعم ما يقرب من 85 000 شخص.	1.5 مليون دولار أمريكي (بالإضافة إلى 0.5 مليون دولار أمريكي كتمويل مشترك)
زامبيا (ينفذه برنامج إعادة إحياء نظم الري لأصحاب الحيازات الصغيرة)	الركيزتان 1 و2. وفر حزمة مدخلات غنية بالمغذيات، إلى جانب معدات الوقاية الشخصية الأساسية. وأنشأ أيضا روابط للمزارعين بالأسواق الموثوق بها والمشتريين ، وشجع اعتماد تكنولوجيات ما بعد الحصاد. ووصل إلى 14 820 أسرة معيشية.	1.6 مليون دولار أمريكي

ملاحظة: استُخدمت مساهمات مرفق تحفيز فقراء الريف أيضا لتوفير تمويل مشترك لمشروعات أكبر تتضمن مكونا للاستجابة لجائحة كوفيد-19 في كوت ديفوار واليمن. ففي كوت ديفوار، قُدمت مساهمة بمبلغ 0.7 مليون دولار أمريكي من أموال المرفق في مشروع دعم الطوارئ الزراعية؛ وفي اليمن، قُدمت مساهمة بمبلغ 3 ملايين دولار أمريكي من أموال المرفق في مشروع تنمية سبل العيش الريفية
